


Spišské Bystré - Zníženie energetickej náročnosti požiarného domu

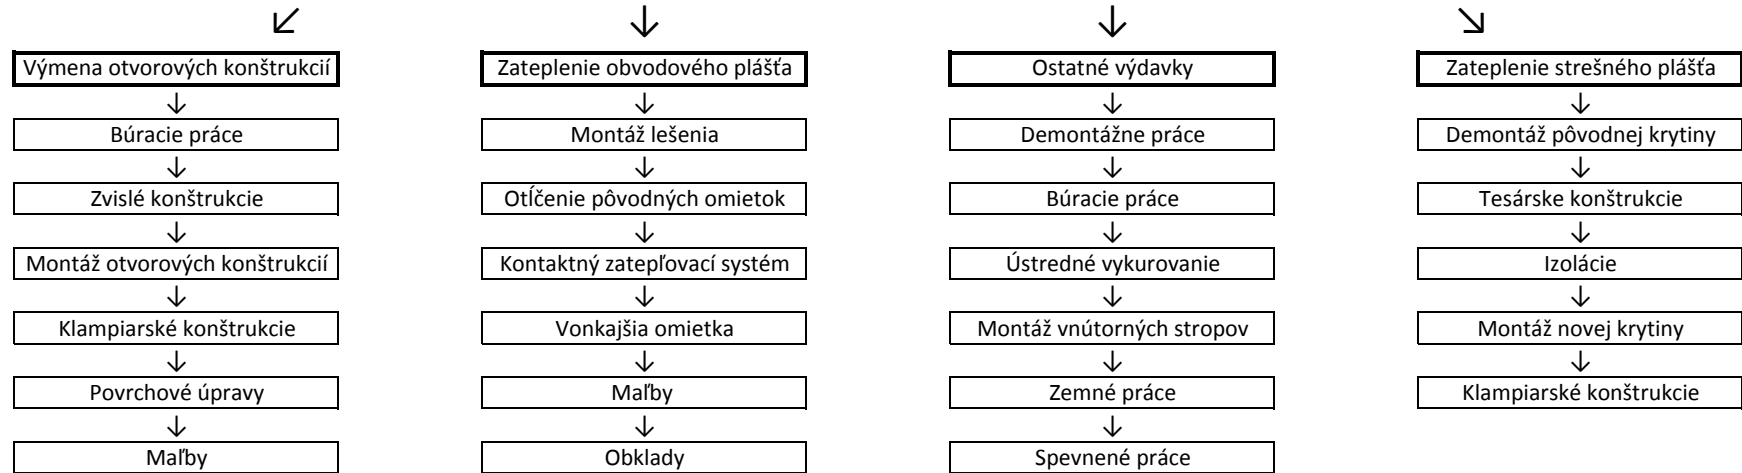

CUKSTAV s.r.o, Groner 1218/ 35, 085 01 Bardejov
Ičo 45344086, Dič 2022947025
cukstav@mail.t-com.sk

Návrh technického riešenia a projektový plán predmetu zákazky

STAVBA: Zníženie energetickej náročnosti požiarného domu v obci Spišské Bystré

a) Časový plán výstavby :

Doba výstavby 6 mesiacov od prebratia staveniska

1. mesiac

- výmena okien a dverí
- montáž lešenia
- montáž zateplenia fasády

2.mesiac

- montáž zateplenia fasády
- montáž zateplenia strechy
- oprava zdravotníckej
- montáž UK

3.mesiac

- omietka fasády
- povlaková krytina strechy
- klampiarske konštrukcie – oplechovania

4.mesiac

- omietka fasády
- povlaková krytina strechy
- klampiarske konštrukcie – oplechovania

5.mesiac

- dokončovacie práce na fasáde
- demontáž lešenia

6 mesiac

- dokončovacie práce na stavbe
- odstraňovanie nedorobkov
- odovzdanie stavby

b) Opatrenie na zníženie hlučnosti a prašnosti:

- pri jednotlivých stavebných operáciách bude používané elektrické náradie z nízkou hlučnosťou
- pri každej práci bude používaná elektrický priemyselný vysávač
- miešanie mált a lepidiel bude prevádzkané mimo priestorov, kde bude pohyb ľudí, aby neprichádzali do kontaktu s danými stavebnými operáciami
- každý deň a v prípade potreby aj viackrát za deň budú poverení pracovníci čistiť komunikačné priestory stavby aby nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu prachu a nečistôt do ďalších priestorov staveniska

- c) Na zabezpečenie kvality výstavby bude spracovaný kontrolný a skúšobný plán, v ktorom bude presne vyšpecifikované, ktoré stavebné operácie podliehajú kontrole, akým spôsobom bude prevedená kontrola, kto bude kontrolu vykonávať a o každej kontrole a prevedenej skúške bude vykonaný protokol o skúške.
- d) Pred zahájením výstavby budú urobené opatrenia, ktoré zabezpečia aby počas výstavby diela nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- e) Pre danú stavbu bude spracovaný havarijný plán, v ktorom budú vyznačené únikové cesty v prípade vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej havarijnej situácie
- f) Tak ako pri každej zákazke, tak aj pri tejto, má naša firma spracovaný plán ochrany zdravia pracovníkov odborne spôsobilou osobou, kde sú zohľadnené rizika prípadného ohrozenia zdravia pracovníkov na stavbe.
- g) Odpad, ktorý vznikne počas výstavby diela, bude odvážaný kontajnermi na riadenú skládku odpadu.
- h) Počas výstavby budú urobené také opatrenia, aby nedochádzalo k poškodeniu jestvujúcej zelene nachádzajúcej sa v oblasti výstavby.
- i) Ak dôjde počas výstavby k výskytu zákonom chránených živočíchov, bude na stavbu privolaná príslušná inštitúcia zaoberajúca sa danou problematikou

Pavol Popovec - konateľ

Manažér projektu	
Zahájenie/Ukončenie projektu	1.7.2019 - 4.12.2019
Ukončenie	0%
Úlohy	28
Zdroje	0

Úlohy

Názov	Zahájenie	Ukončenie
Spišské Bystré	1.7.2019	3.12.2019
Výmena otvorových konštrukcií	22.7.2019	2.12.2019
Zvislé konštrukcie	26.7.2019	8.8.2019
Povrchové úpravy	16.9.2019	24.9.2019
Ostatné práce	22.7.2019	9.8.2019
Konštrukcie klampiarske	9.9.2019	2.10.2019
Konštrukcie stolárske	12.8.2019	4.9.2019
Maľby	11.11.2019	2.12.2019
Zateplenie obvodového plášťa	22.7.2019	24.10.2019
Povrchové úpravy	9.9.2019	26.9.2019
Ostatné práce	22.7.2019	30.8.2019
Obklady	18.10.2019	24.10.2019
Ostatné práce	1.7.2019	3.12.2019
Zemné práce	4.10.2019	17.10.2019
Spevnené plochy	21.10.2019	29.10.2019
Povrchové úpravy	3.9.2019	11.9.2019
Búracie a montážne práce	1.7.2019	19.7.2019
Ústredné vykurovanie	22.7.2019	2.8.2019
Drevostavby	23.8.2019	29.8.2019
Konštrukcie klampiarske	16.8.2019	26.8.2019
Maľby	11.11.2019	3.12.2019
Zateplenie strešného plášťa	22.7.2019	1.11.2019
Ostatné práce	16.8.2019	26.9.2019
Povlakové krytiny	26.9.2019	16.10.2019
Izolácie	9.9.2019	24.9.2019
Konštrukcie tesárske	12.8.2019	29.8.2019
Konštrukcie klampiarske1	22.7.2019	16.8.2019
Konštrukcie klampiarske2	21.10.2019	1.11.2019

Untitled Gantt Project

Ganttov diagram

7.6.2019

3

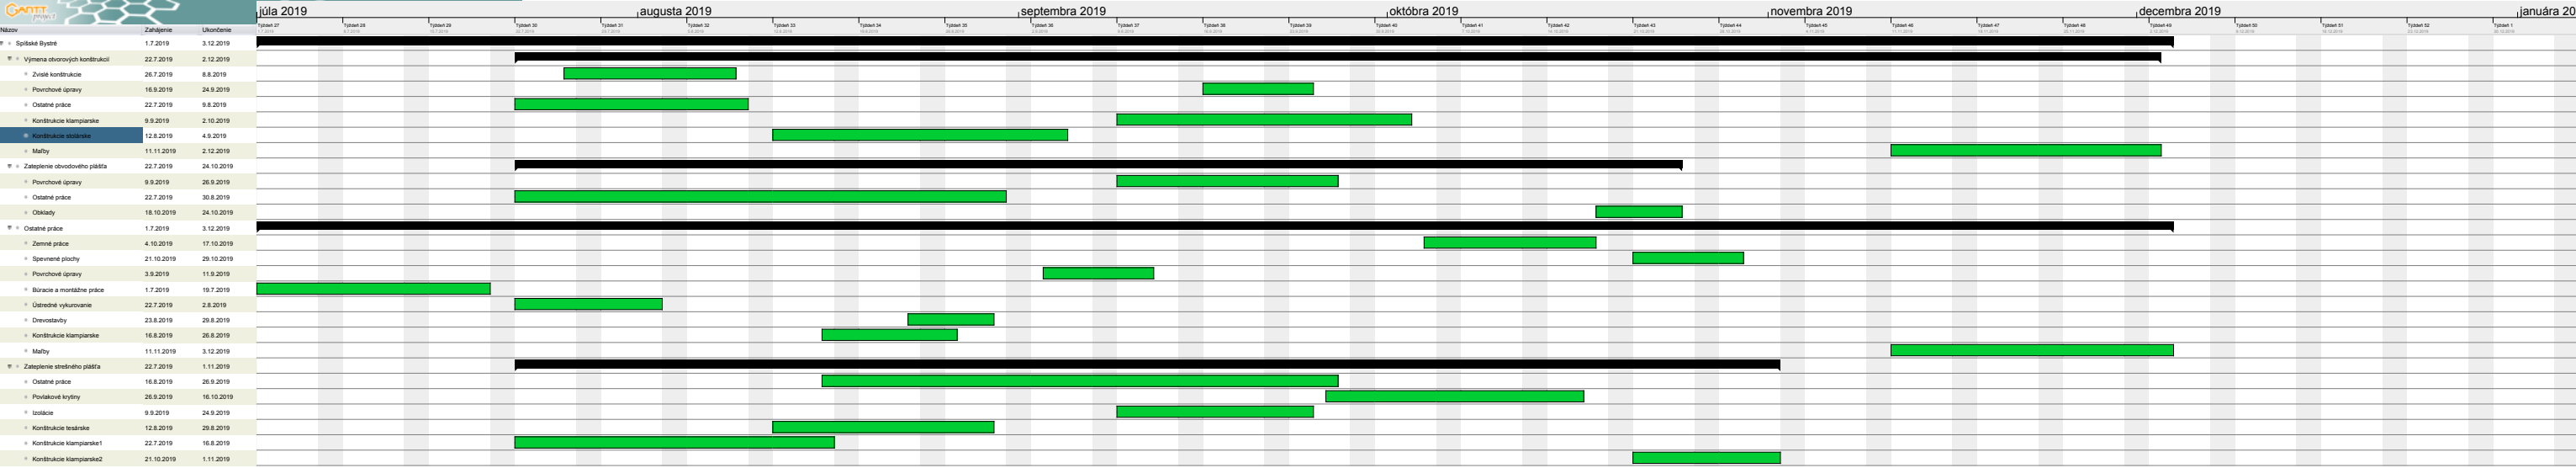


Diagram zdrojov

