











































Identifil		Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predch	Štvrť. 2, 2018 apr   máj   jún   Štvrť. 3, 2018 júl			
1		★	<b>Materská škôlka v obci Mirkovce</b>	196 dni	Po 3.5.21	Po 31.1.22					
2		★	Zariadenie staveniska	2 dni	Po 3.5.21	Ut 4.5.21					
3		★	SO 01 Materská škola	196 dni	Po 3.5.21	Po 31.1.22					
4		★	<b>Zemné práce</b>	5 dni	Str 5.5.21	Ut 11.5.21	2				
5		★	<b>Zakladanie</b>	11 dni	Str 12.5.21	Str 26.5.21	4				
6		★	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>	35 dni	Št 27.5.21	Str 14.7.21	5				
7		★	<b>Vodorovné konštrukcie</b>	7 dni	Št 15.7.21	Pi 23.7.21	6				
8		★	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>	84 dni	Pi 30.7.21	Str 24.11.21					
9		★	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	6 dni	Po 26.7.21	Po 2.8.21	7				
10		★	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>	4 dni	Št 27.5.21	Ut 1.6.21	5				
11		★	<b>Izolácie striech</b>	12 dni	Po 26.7.21	Ut 10.8.21	7				
12		★	<b>Izolácie tepelné</b>	13 dni	Pi 30.7.21	Ut 17.8.21	13				
13		★	<b>Konštrukcie tesárske</b>	4 dni	Po 26.7.21	Št 29.7.21	7				
14		★	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>	8 dni	Po 26.7.21	Str 4.8.21	7				
15		★	<b>Konštrukcie klampiarske</b>	14 dni	Pi 30.7.21	Str 18.8.21	13				
16		★	<b>Konštrukcie stolárske</b>	20 dni	Po 26.7.21	Pi 20.8.21	7				
17		★	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>	16 dni	Po 26.7.21	Po 16.8.21	7				
18		★	<b>Podlahy z dlaždíc</b>	10 dni	Št 25.11.21	Str 8.12.21	8				
19		★	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>	11 dni	Št 9.12.21	Št 23.12.21	20				
20		★	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>	10 dni	Št 25.11.21	Str 8.12.21	8				
21		★	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>	7 dni	Po 10.1.22	Ut 18.1.22	19				
22		★?	<b>Zdravotechnika</b>								
23		★	Vnútorná kanalizácia	13 dni	Str 12.5.21	Pi 28.5.21	4				
24		★	Vnútorný vodovod	20 dni	Št 15.7.21	Str 11.8.21	6				

Projekt: Harmonogram Čaňa  
Dátum: Po 22.3.21

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

Identifik		Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predch	Štvrť. 2, 2018				Štvrť. 3, 2018
								apr	máj	jún	júl	
25			Plynovod	18 dni	Št 12.8.21	Po 6.9.21	24					
26			Zariadenie predmety	14 dni	Po 10.1.22	Št 27.1.22	18					
27			Ústredné kúrenie									
28			Kotolňa + strojovňa	15 dni	Po 26.7.21	Pi 13.8.21	7					
29			Rozvody	20 dni	Po 26.7.21	Pi 20.8.21	7					
30			Amatúry	15 dni	Po 23.8.21	Pi 10.9.21	29					
31			Vykurovacie telesá	5 dni	Št 25.11.21	Str 1.12.21	8					
32			Elektroinštalácia									
33			Rozvádzače	3 dni	Pi 20.8.21	Ut 24.8.21	34					
34			Káble a vodiče	19 dni	Po 26.7.21	Št 19.8.21	7					
35			Osvetľovacie telesá	5 dni	Str 19.1.22	Ut 25.1.22	21					
36			Bleskozvod	8 dni	Št 19.8.21	Po 30.8.21	15					
37			Rekuperácia	13 dni	Str 1.12.21	Pi 17.12.21						
38			SO 02 Kanalizačná prípojka									
39			SO 02 Kanalizačná prípojka	36 dni	Ut 20.4.21	Ut 8.6.21						
40			SO 03 Vodovodná prípojka	20 dni	Ut 20.4.21	Po 17.5.21						
41			SO 04 Plynova prípojka	15 dni	Ut 20.4.21	Po 10.5.21						
42			SO 05 NN prípojka									
43			SO 01.1. Doplnok ASR									
44			Zemné práce	5 dni	Str 14.4.21	Ut 20.4.21						
45			Zakladanie	11 dni	Str 21.4.21	Str 5.5.21	44					
46			Zvislé a kompletne konštrukcie	7 dni	Št 6.5.21	Pi 14.5.21	45					
47			Vodorovné konštrukcie	2 dni	Št 15.7.21	Pi 16.7.21	6					
48			Komunikácie	3 dni	Št 25.11.21	Po 29.11.21	8					

Identifik		Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predch	Štvrť. 2, 2018 apr   máj   jún   Štvrť. 3, 2018 júl			
49		★	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 dni	Št 16.9.21	Pi 24.9.21					
50		★	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 dni	Po 19.7.21	Ut 20.7.21	47				
51		★	Izolácie striech	4 dni	Str 7.7.21	So 10.7.21					
52		★	Konštrukcie - drevostavby	3 dni	Po 12.7.21	Str 14.7.21	51				
53		★	Konštrukcie klampiarske	2 dni	Št 15.7.21	Pi 16.7.21	52				
54		★	Konštrukcie doplnkové kovové	2 dni	Pi 15.10.21	Po 18.10.21					
55		★?	02. Spevnené plochy								
56		★	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 dni	Str 1.12.21	Pi 3.12.21	57				
57		★	Komunikácie	5 dni	Str 24.11.21	Ut 30.11.21	58				
58		★	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 dni	Št 18.11.21	Ut 23.11.21					
59		★	Vypratanie staveniska	2 dni	Str 26.1.22	Št 27.1.22	35				
60		★	Odobzkanie	2 dni	Pi 28.1.22	Po 31.1.22	59				

Projekt: Harmonogram Čaňa Dátum: Po 22.3.21	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

Štvrt. 3, 2018  
júl

aug

sep

Štvrť. 4, 2018  
okt

nov

---

dec

Štvrť. 1, 2019  
jan

feb

mar

Štvrť. 2, 2019  
apr

máj

Projekt: Harmonogram Čaňa  
Dátum: Po 22.3.21

## Úloha



### Neaktívna úloha

Manuálny súhrn



Externý medzník



Rozdelit'



Neaktívny medzník



Manuálny súhrn



Termin



Medzník



## Neaktívny súhrn



Iba začiatok



Priebeh



## Súhrn projektu





Iba trvanie





### Externé úlohy






















Projekt: Harmonogram Čaña  
Dátum: Po 22.3.21

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			




Projekt: Harmonogram Čaña Dátum: Po 22.3.21	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			



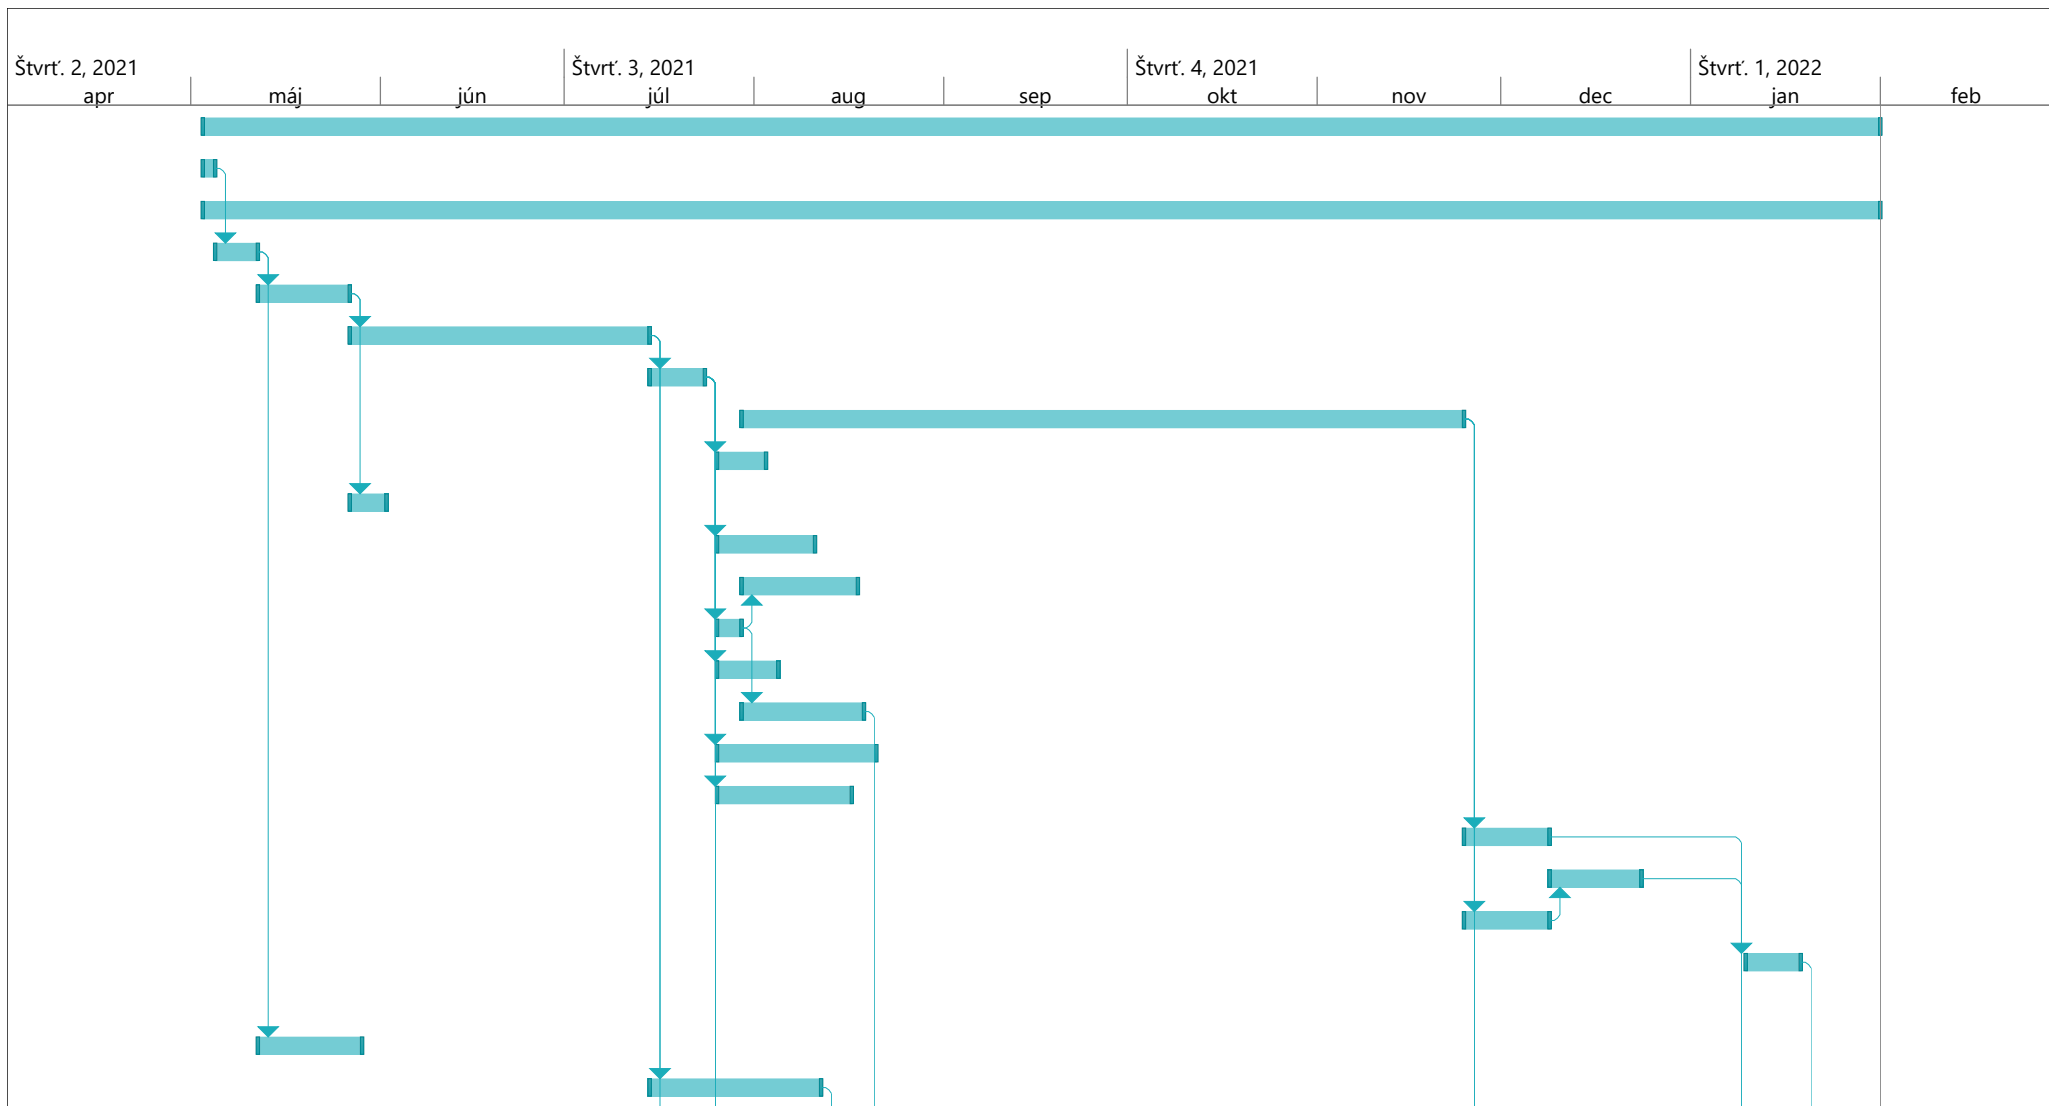

Projekt: Harmonogram Čaña  
Dátum: Po 22.3.21

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

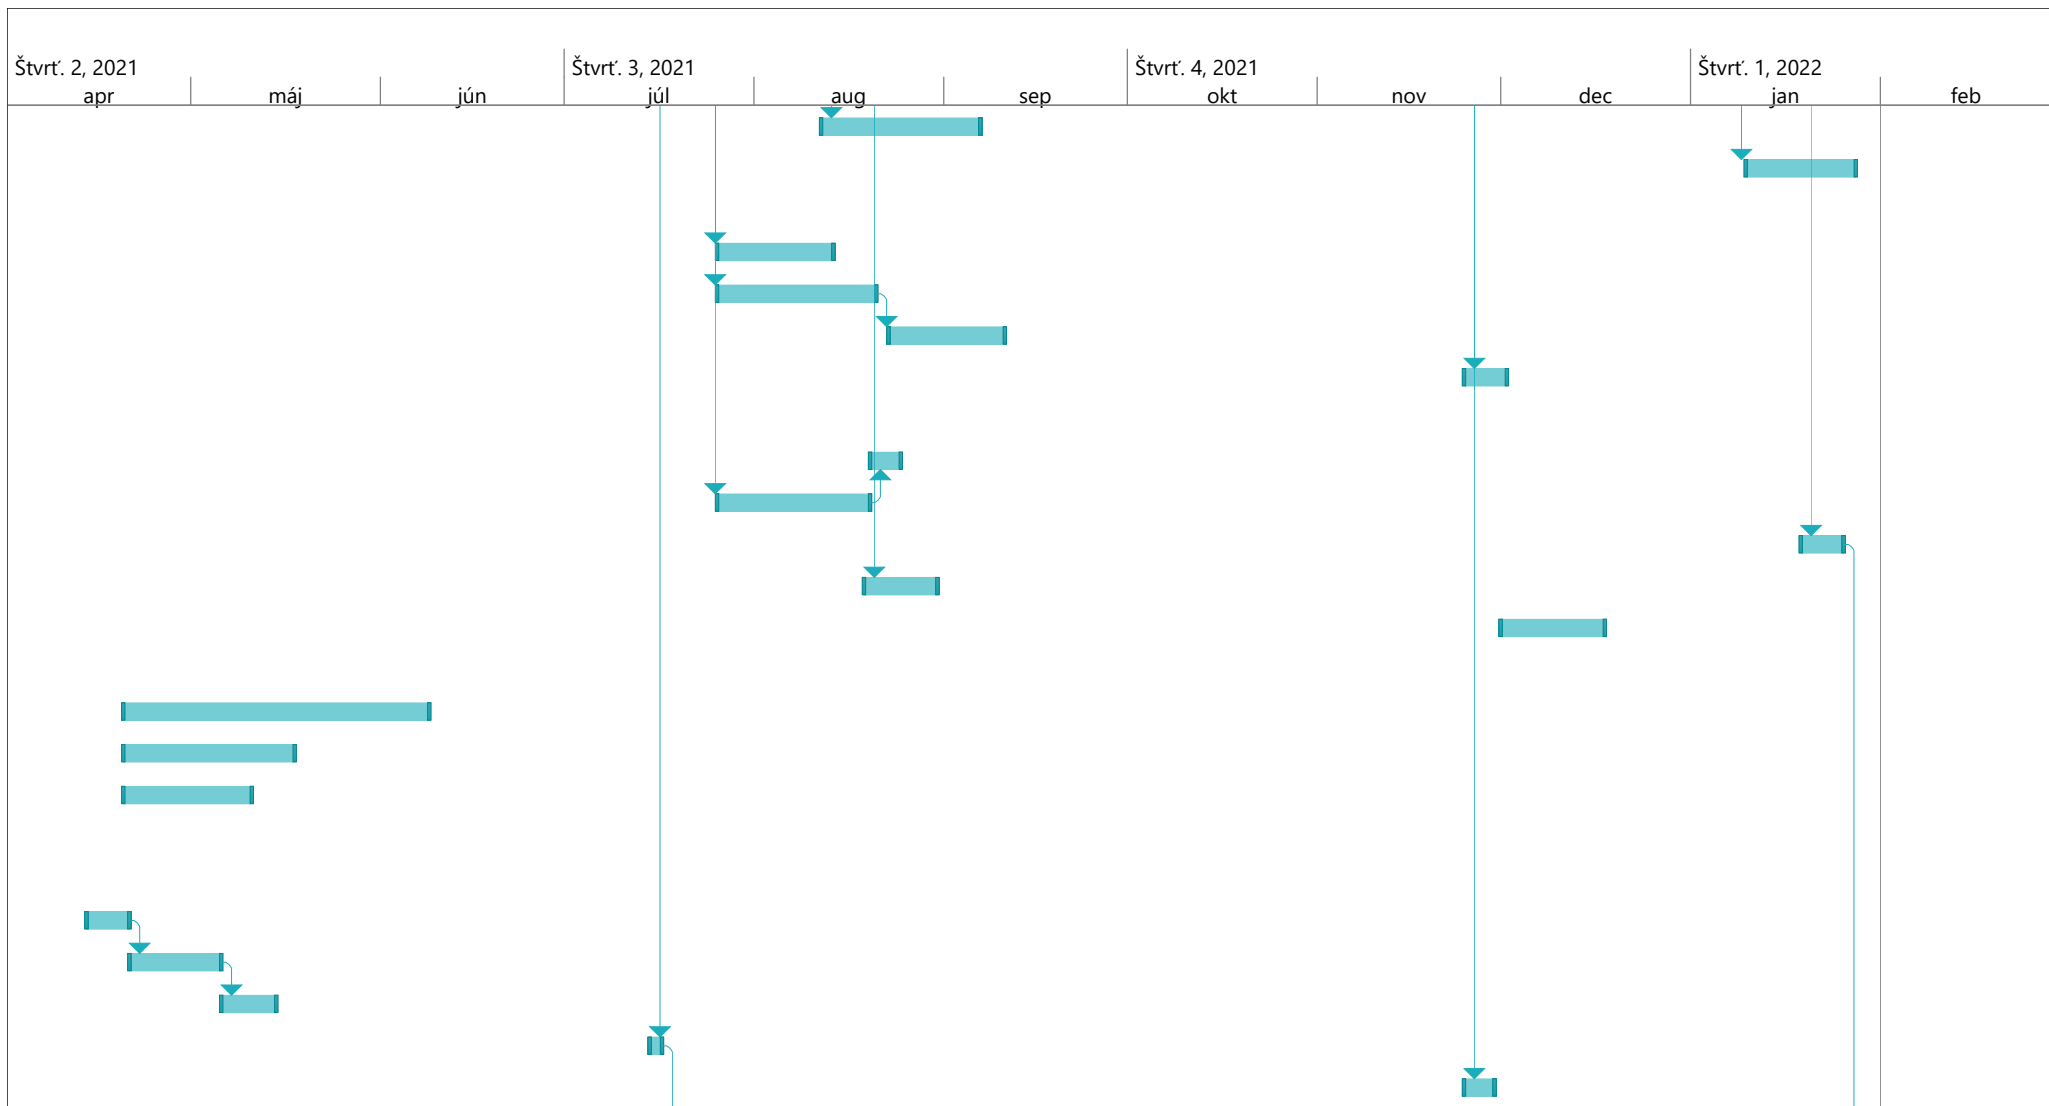

Projekt: Harmonogram Čaña Dátum: Po 22.3.21	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			

