


Časová OS harmonogramu -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

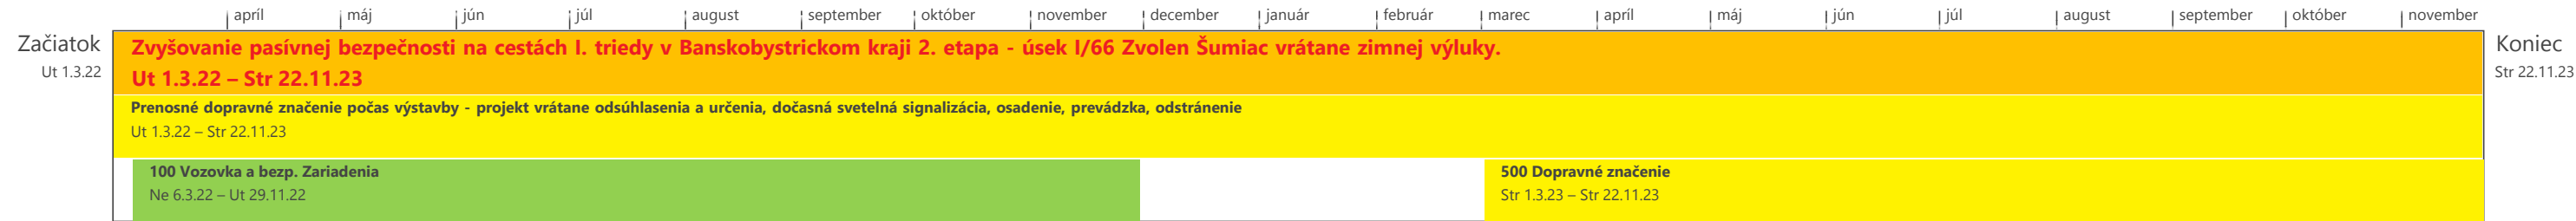

Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

identifik	i	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023				
						1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	
1		Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen Šumiac vrátane zimnej výluky.	540 dni	Ut 1.3.22	Str 22.11.23	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen Šumiac vrátane zimnej výluky.								22.11
2		Všeobecné položky		Ut 1.3.22	Str 22.11.23	Všeobecné položky								22.11
3		Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	120 dni	Ut 1.3.22	Ut 28.6.22	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)								28.6
4		Prenosné dopravné značenie počas výstavby - projekt vrátane odsúhlasenia a určenia, dočasná svetelná signalizácia, osadenie, prevádzka, odstránenie	540 dni	Ut 1.3.22	Str 22.11.23	Prenosné dopravné značenie počas výstavby - projekt vrátane odsúhlasenia a určenia, dočasná svetelná signalizácia, osadenie, prevádzka, odstránenie								22.11
5		Dokumentácia skutočného realizovania stavby, bez geodetického zamerania	120 dni	Ut 1.3.22	Ut 28.6.22	a skutočného realizovania stavby, bez geodetického zamerania								28.6
6		100 Vozovka a bezp. Zariadenia	269 dni	Ne 6.3.22	Ut 29.11.22	100 Vozovka a bezp. Zariadenia								29.11
7		Odstránenie cestného zvodidla oceľového	12 dni	Ne 6.3.22	Št 17.3.22									
8		Demontáž pásnic, stĺpikov s odvozom do 15 km	12 dni	Pi 18.3.22	Ut 29.3.22									
9		Odstránenie jednostranného cestného zvodidla oceľového UZ N2, H1	12 dni	Str 30.3.22	Ne 10.4.22									
10		Odstránenie zábradľového zvodidla na moste	12 dni	Po 11.4.22	Pi 22.4.22									


Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023			
					1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok
11	Demontáž pásnic, stĺpikov s odvozom do 15 km	10 dni	So 23.4.22	Po 2.5.22								
12	Odstránenie oceľového zábradlia	12 dni	Ut 3.5.22	So 14.5.22								
13	Demontáž stĺpikov a dielov zábradlia s odvozom do 15 km	8 dni	Ne 15.5.22	Ne 22.5.22								
14	Odstránenie vodiacich zariadení, cestných stĺpikov a odraziek	6 dni	Po 23.5.22	So 28.5.22								
15	Demontáž smerových stĺpikov	9 dni	Ne 29.5.22	Po 6.6.22								
16	Demontáž nadstavcov na zvodidlá	6 dni	Ut 7.6.22	Ne 12.6.22								
17	Demontáž zvodidlových odraziek	5 dni	Po 13.6.22	Pi 17.6.22								
18	Osadenie cestného zvodidla s úrovňou zadržania H1	10 dni	So 18.6.22	Po 27.6.22								
19	Osadenie cestného motozvodidla s úrovňou zadržania H1	18 dni	Ut 28.6.22	Pi 15.7.22								
20	Zvýšenie úrovne zadržania cestného zvodidla oceľového za EA koncovkou, tlmičom	5 dni	So 16.7.22	Str 20.7.22								
21	Demontáž pásnic, dodávka a zahustenie stĺpikov , spätná montáž s doplnením nového spojovacieho	12 dni	Št 21.7.22	Po 1.8.22								
22	Osadenie jednostranného cestného oceľového zvodidla s úrovňou zadržania H2	5 dni	Ut 2.8.22	So 6.8.22								

Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac


Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023			
					1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok
23	Osadenie zábradľového zvodidla na moste s úrovňou zadržania H2	8 dni	Ne 7.8.22	Ne 14.8.22								
24	Osadenie zábradľového zvodidla na moste so zvislou výplňou s úrovňou zadržania H2	8 dni	Po 15.8.22	Po 22.8.22								
25	Osadenie zábradľového zvodidla na moste bez výplne s úrovňou zadržania H2	10 dni	Ut 23.8.22	Št 1.9.22								
26	Dodávka a montáž zábradľového zvodidla , kompletne zhotovenie - vrátane kotvenia, výškových nábehov,	8 dni	Pi 2.9.22	Pi 9.9.22								
27	Osadenie oceľového zábradlia na moste so zvislou výplňou výšky 1,10 m	8 dni	So 10.9.22	So 17.9.22								
28	Osadenie celoreflexných vodiacich prvkov- smerových stĺpikov a odraziek	12 dni	Ne 18.9.22	Št 29.9.22								
29	Osadenie celoreflexných cestných smerových stĺpikov do kot. pätky	12 dni	Pi 30.9.22	Ut 11.10.22								
30	Osadenie celoreflexných cestných smerových stĺpikov so snehovou výtyčkou do kot. pätky	10 dni	Str 12.10.22	Pi 21.10.22								
31	Osadenie celoreflexných smerových stĺpikov na zvodidlo	12 dni	So 22.10.22	Str 2.11.22								
32	Osadenie celoreflexných odraziek do zvodidiel	10 dni	Št 3.11.22	So 12.11.22								
33	Osadenie celoreflexných odraziek na betónové zvodidlo	12 dni	Ne 13.11.22	Št 24.11.22								
34	Označenie trvalej prekážky žltó-čiernymi pruhmi dodávka s ukotvením	9 dni	Ne 13.11.22	Po 21.11.22								

Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

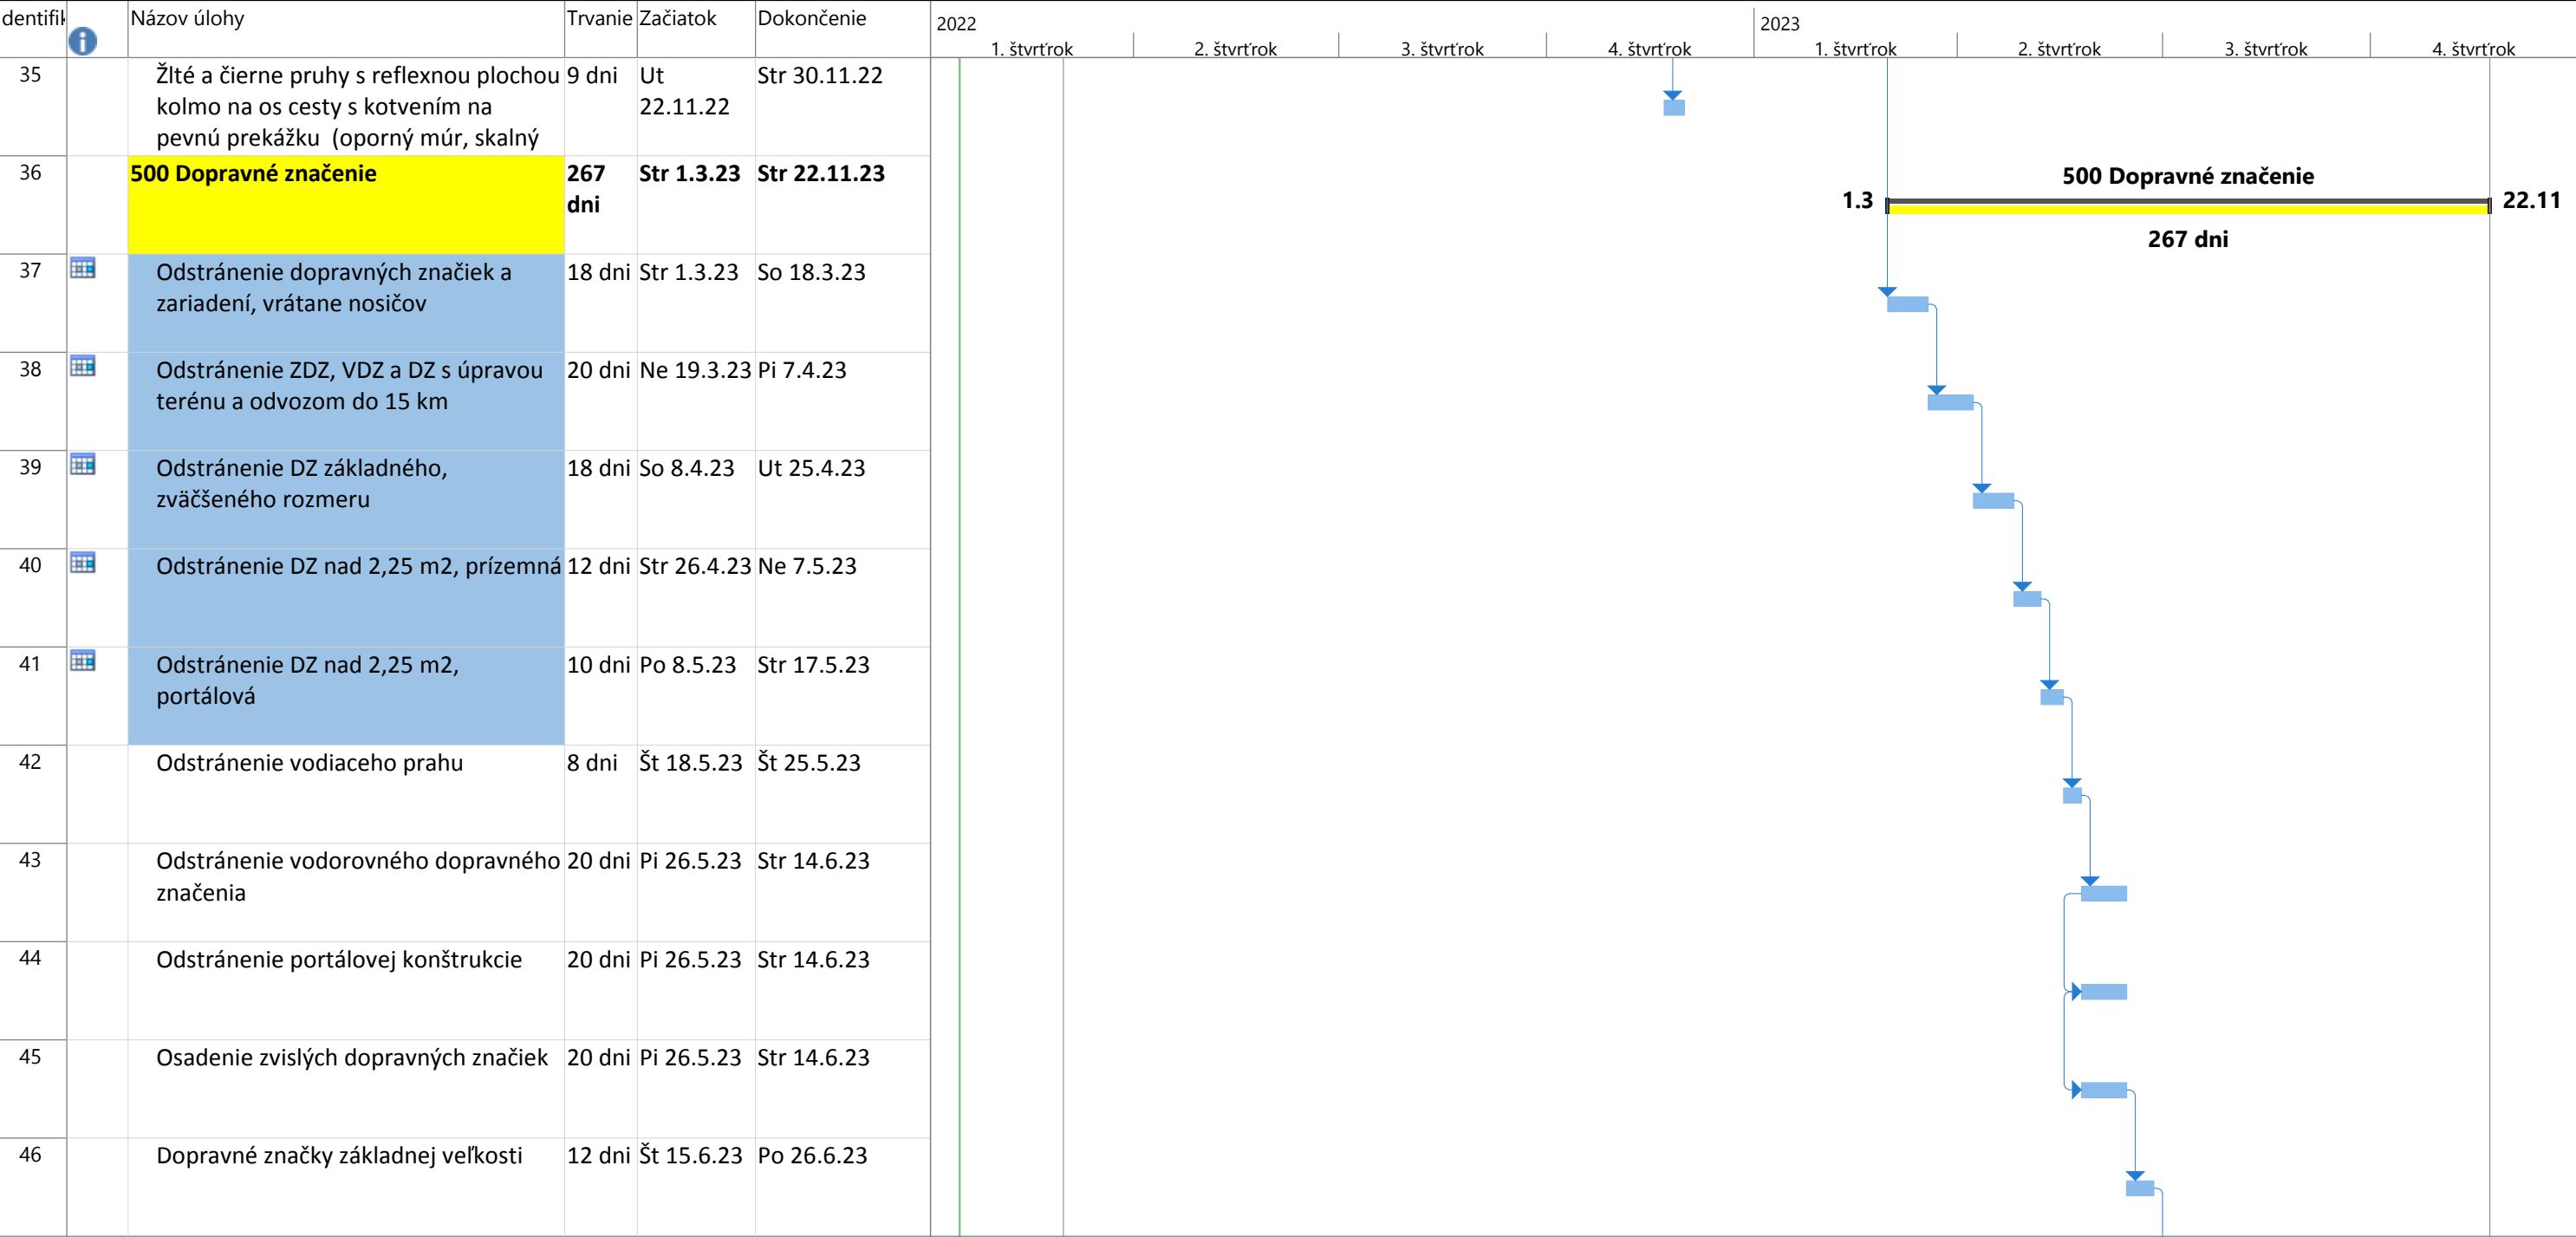


Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023			
					1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok
47	Dopravné značky zväčšenej veľkosti	8 dni	Ut 27.6.23	Ut 4.7.23								
48	Dopravné značky na fluorescenčnom podklade	9 dni	Str 5.7.23	Št 13.7.23								
49	Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné	10 dni	Pi 14.7.23	Ne 23.7.23								
50	Dopravné značky nad 2,25 m2 , prízemné, nosiče 100 NE 2	12 dni	Po 24.7.23	Pi 4.8.23								
51	Dopravné značky nad 2,25 m2, prízemné, nosiče 70HE 2	12 dni	So 5.8.23	Str 16.8.23								
52	Dopravné značky nad 2,25 m2, portálové	10 dni	Št 17.8.23	So 26.8.23								
53	Dopravné značky „Kilometrovník“ .	5 dni	Ne 27.8.23	Št 31.8.23								
54	Dopravné značky „IS 17a- IS 24“ s variabilnou plochou	10 dni	Pi 1.9.23	Ne 10.9.23								
55	Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou do 1500 mm	5 dni	Po 11.9.23	Pi 15.9.23								
56	Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou nad 1500 mm a plochou menšou 2,25 m2	8 dni	So 16.9.23	So 23.9.23								
57	Dopravné značky „IS 17a - IS 24“ so šírkou nad 1500 mm a plochou väčšou 2,25 m2	9 dni	Ne 24.9.23	Po 2.10.23								
58	Zriadenie vodorovného dopravného značenia	6 dni	Ut 3.10.23	Ne 8.10.23								

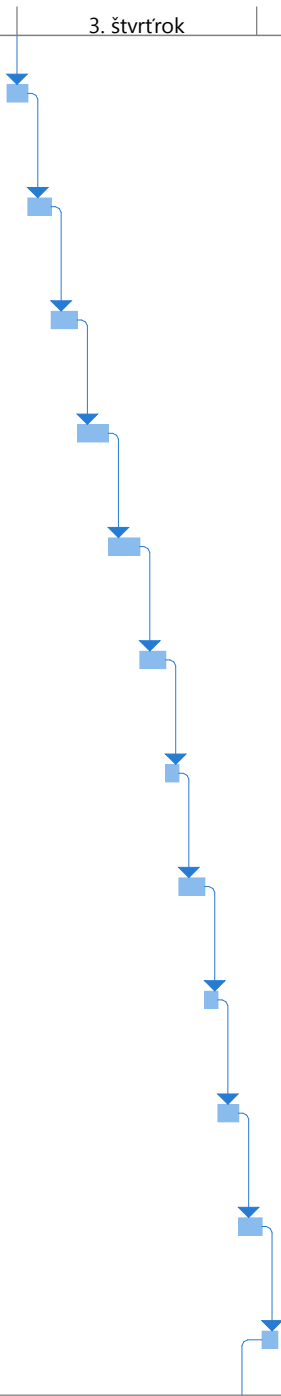


Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

Identifik	i	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023			
						1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok
59		Zriadenie vodorovného dopravného značenia plast biely/žltý dvojzložkový	5 dni	Ut 3.10.23	So 7.10.23								
60		Zriadenie vodorovného dopravného značenia V16 plast biely dvojzložkový	12 dni	Ut 3.10.23	So 14.10.23								
61		Zriadenie vodorovného dopravného značenia plast biely dvojzložkový	15 dni	Ne 15.10.23	Ne 29.10.23								
62		Osadenie LED priechodu pre chodcov s detektorom pohybu	15 dni	Po 30.10.23	Po 13.11.23								
63		Doplnenie LED gombíkov	8 dni	Ut 14.11.23	Ut 21.11.23								
64		Doplnenie tretieho stožiaru pre chodcov	8 dni	Ut 14.11.23	Ut 21.11.23								
65		Osadenie trvalých dopravných gombíkov - aktívnych LED so zabudovaným solárnym článkom a	8 dni	Po 30.10.23	Po 6.11.23								
66		Osadenie LED dopravných gombíkov (biely/biely) - obojstranné	9 dni	Ut 7.11.23	Str 15.11.23								
67		Osadenie LED dopravných gombíkov (biely/0) - jednostranné	7 dni	Št 16.11.23	Str 22.11.23								
68		Osadenie LED dopravných gombíkov (červený/0) - jednostranné	7 dni	Št 16.11.23	Str 22.11.23								
69		Osadenie odrazkových TDG (biely/biely) - obojstranné	7 dni	Št 16.11.23	Str 22.11.23								
70		Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom	7 dni	Št 16.11.23	Str 22.11.23								



Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

Identifik		Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022				2023			
						1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok	1. štvrťrok	2. štvrťrok	3. štvrťrok	4. štvrťrok
71		Ochranný náter existujúcej portálovej konštrukcie	7 dni	Št 16.11.23	Str 22.11.23								
72		Vodiaci prah	7 dni	Št 16.11.23	Str 22.11.23								

Harmonogram -ZVÝŠENIE PASÍVNEJ BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH I.tried v BB kraji-I/66 Banská Bystrica - Šumiac

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2022								2023							
1	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen Šumiac vrátane zimnej výluky.	540 dni	Ut 1.3.22	Str 22.11.23																
2	Všeobecné položky		Ut 1.3.22	Str 22.11.23																
6	100 Vozovka a bezp. Zariadenia	269 dni	Ne 6.3.22	Ut 29.11.22																
36	500 Dopravné značenie	267 dni	Str 1.3.23	Str 22.11.23																

1.3

22.11

1.3

22.11

6.3

29.11

1.3

22.11

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen Šumiac vrátane zimnej výluky.

540 dni

Všeobecné položky

100 Vozovka a bezp. Zariadenia

269 dni

500 Dopravné značenie

267 dni
