


entifikácia	P. Č.	TE	NÁZOV PROCESU	Začiatok		Dokončenie		3 apr '23							10 apr '23							17 apr '23							24 apr '23							1 máj '23						
				P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P			
1	1		Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	Po 3.4.23	Št 14.9.23																																					
2	2		01.Stavebná časť	Po 3.4.23	Št 14.9.23																																					
3	2.1		Práce a dodávky HSV	Po 3.4.23	Po 5.6.23																																					
4	2.1.1		Zemné práce	Po 3.4.23	Pi 7.4.23																																					
5	2.1.2		Zakladanie	Po 10.4.23	Str 19.4.23																																					
6	2.1.3		Zvislé a kompletne konštrukcie	Str 19.4.23	Pi 28.4.23																																					
7	2.1.4		Vodorovné konštrukcie	Št 27.4.23	Ut 2.5.23																																					
8	2.1.5		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Ut 2.5.23	Po 5.6.23																																					
9	2.1.6		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Po 3.4.23	Pi 21.4.23																																					
10	2.1.7		Presun hmôt HSV	Po 3.4.23	Po 5.6.23																																					
11	2.2		Práce a dodávky PSV	Po 3.4.23	Ut 12.9.23																																					
12	2.2.1		Izolácie proti vode a vlhkosti	Str 19.4.23	Št 20.4.23																																					
13	2.2.2		Izolácie striech, povlakové krytiny	Po 1.5.23	Pi 19.5.23																																					
14	2.2.3		Izolácie tepelné	Str 3.5.23	Ut 16.5.23																																					
15	2.2.4		Konštrukcie - drevostavby	Po 3.4.23	Str 24.5.23																																					
16	2.2.5		Konštrukcie klampiarske	Str 5.4.23	Str 24.5.23																																					
17	2.2.6		Konštrukcie stolárske	Po 3.4.23	Ut 12.9.23																																					
18	2.2.7		Konštrukcie doplnkové kovové	Po 10.4.23	Str 14.6.23																																					
19	2.2.8		Podlahy z dlaždíc	Ut 1.8.23	Po 21.8.23																																					
20	2.2.9		Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	Po 21.8.23	Str 23.8.23																																					
21	2.2.10		Podlahy povlakové	Po 10.4.23	Pi 8.9.23																																					
22	2.2.11		Dokončovacie práce	Po 21.8.23	Po 11.9.23																																					
23	2.3		Práce a dodávky M	Po 22.5.23	Pi 9.6.23																																					
24	2.3.1		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	Po 22.5.23	Pi 9.6.23																																					
25	2.3.2		Ostatné- systém zelenej strechy	Po 22.5.23	Pi 9.6.23																																					
26	3		02.Elektroinštalácia	Str 19.4.23	Ut 12.9.23																																					
27	3.1		Elektromontáže	Str 19.4.23	Ut 12.9.23																																					
28	3.2		DOZBROJENIE RH	Št 1.6.23	Str 7.6.23																																					
29	3.3		ROZVÁDZAČ RSM	Št 1.6.23	Št 1.6.23																																					
30	3.4		Montáže oznam. a zabezp. zariadení	Str 19.4.23	Ut 12.9.23																																					
31	3.5		Bleskozvod	Št 25.5.23	Pi 16.6.23																																					
32	4		03.- Ústredné kúrenie	Št 27.4.23	Str 30.8.23																																					
33	4.1		Izolácie tepelné	Pi 28.4.23	Pi 26.5.23																																					
34	4.2		Ústredné kúrenie, kotolne	Ut 9.5.23	Str 10.5.23																																					
35	4.3		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	Št 27.4.23	Pi 26.5.23																																					
36	4.4		Ústredné kúrenie, armatúry.	Št 27.4.23	Pi 26.5.23																																					
37	4.5		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	Po 28.8.23	Str 30.8.23																																					
38	5		04 - Zdravotechnika	Št 27.4.23	Št 31.8.23																																					
39	5.1		Izolácie tepelné	Št 27.4.23	Pi 26.5.23																																					
40	5.2		Zdravotech. vnútorná kanalizácia	Št 27.4.23	Pi 26.5.23																																					
41	5.3		Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Št 27.4.23	Pi 26.5.23																																					
42	5.4		Zdravotechnika - zariad. predmety	Po 21.8.23	Št 31.8.23																																					
43	5.5		Konštrukcie - drevostavby	Po 21.8.23	Str 23.8.23																																					
44	6		05. - Dažďová kanalizácia	Po 3.4.23	Pi 7.4.23																																					
45	6.1		Zemné práce	Po 3.4.23	Pi 7.4.23																																					
46	6.2		Vodorovné konštrukcie	Po 3.4.23	Pi 7.4.23																																					

Projekt: Tech. predpis Datum: Št 16.3.23	Úkol		Zahrnutý milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Kritický úkol		Zahrnutý průběh		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Milník		Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrnný		Vnější úkoly		Ruční úkol		Průběh	
	Zahrnutý úkol		Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání			
	Zahrnutý kritický úkol		Seskupit podle souhrnu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			



Projekt: Tech. predpis Datum: Št 16.3.23	Úkol		Zahrnutý milník		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Kritický úkol		Zahrnutý průběh		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Milník		Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrnný		Vnější úkoly		Ruční úkol		Průběh	
	Zahrnutý úkol		Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání			
	Zahrnutý kritický úkol		Seskupit podle souhrnu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			

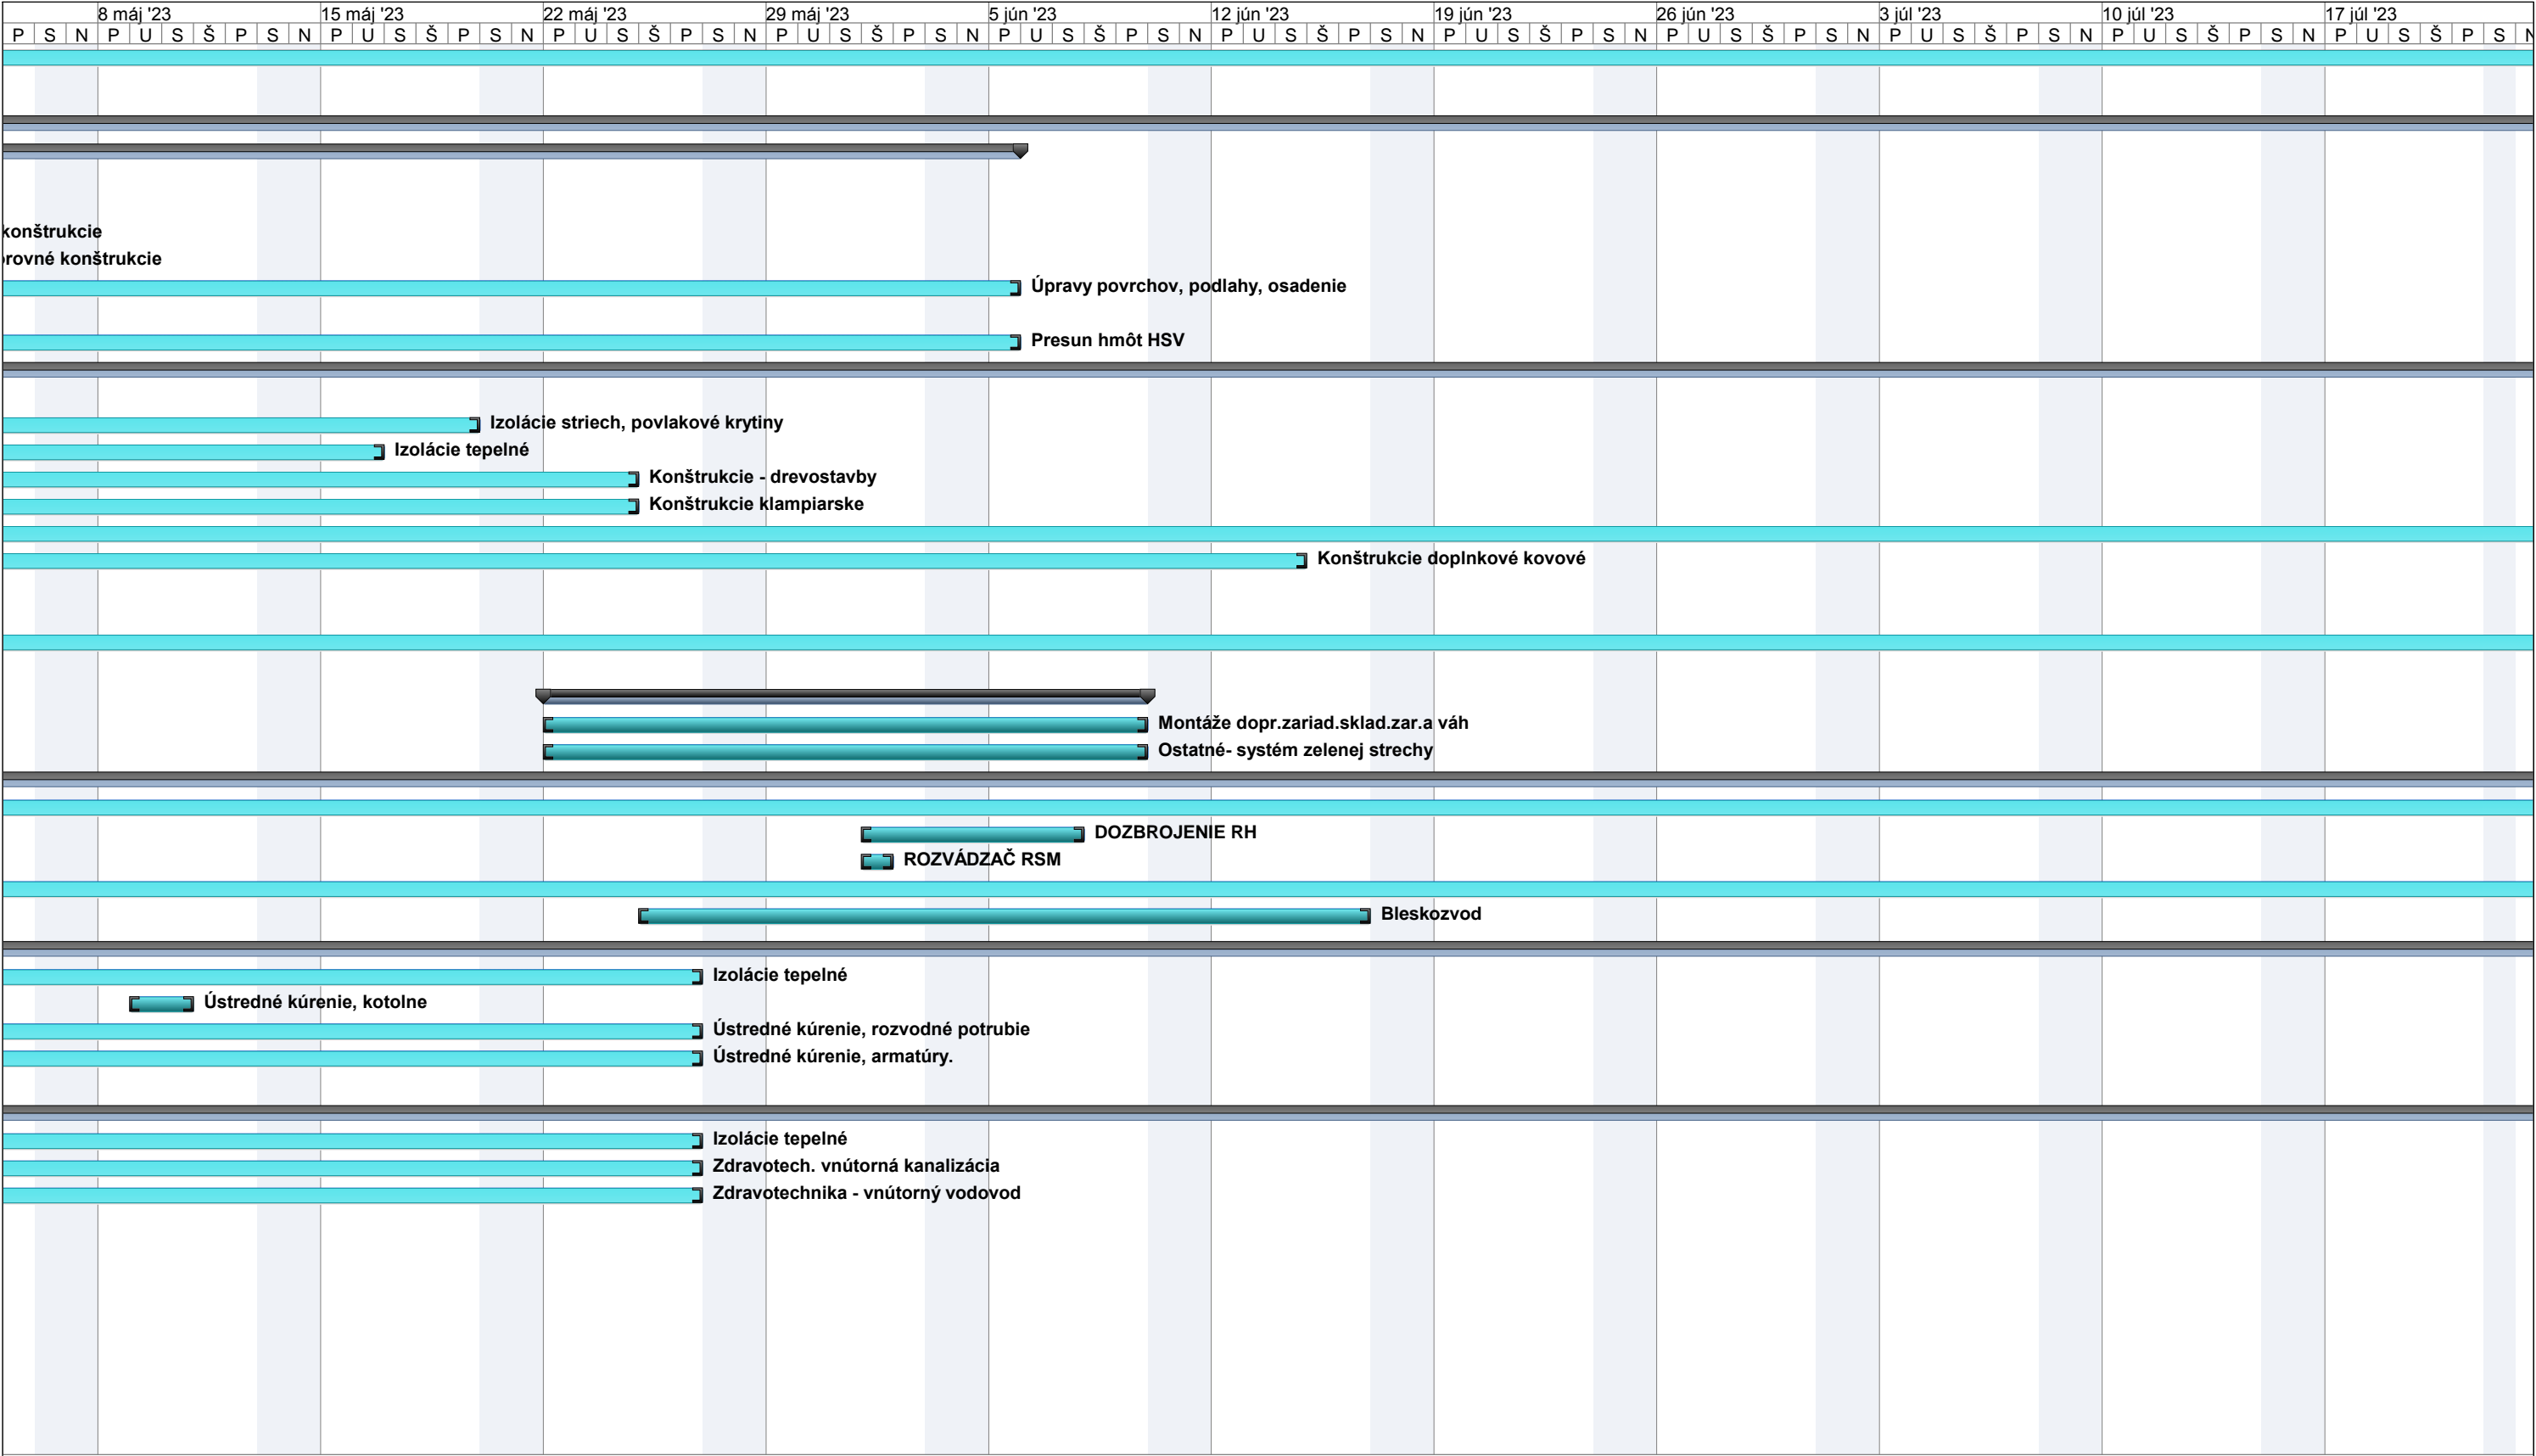
