

"Revitalizácia vnútrobloku juh kežmarok" Harmonogram

Kód položky	Popis	MJ	Rok				2022													
			Mesiac				August					September				Október				
			Týždeň				32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			Začiatok	Koniec	Nh	Množstvo														
226	Revitalizácia vnútrobloku juh kežmarok		01. 08. 2022	29. 05. 2023	0.000	0.000														
1	Revitalizácia vnútrobloku juh kežmarok		01. 08. 2022	29. 05. 2023	0.000	0.000														
VP	Vlastné položky		01. 08. 2022	03. 03. 2023	0.000	0.000														
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		22. 08. 2022	14. 02. 2023	0.000	0.000														
1	ZEMNE PRÁCE		22. 08. 2022	30. 12. 2022	0.000	0.000														
100	Sadové úpravy (samostatný výkaz)	EU	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	1.000														
113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	71.250														
113106125	Rozobratie rigolov z tvárnic a betón.zalievky	m2	22. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	366.620														
113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	22. 08. 2022	27. 08. 2022	0.000	1605.193														
113107111a	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	2432.640														
113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	131.450														
113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	22. 08. 2022	28. 11. 2022	0.000	1665.393														
113107130a	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	30. 12. 2022	0.000	2432.640														
113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	22. 08. 2022	08. 09. 2022	0.000	1605.193														
113107142a	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, do 200 m2 - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	16. 09. 2022	0.000	2432.640														
113201111	Výtrhanie obrubníkov schodiskových	m	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	143.780														
113202111	Výtrhanie krajníkov alebo obrubníkov	m	22. 08. 2022	27. 08. 2022	0.000	1251.834														
113202111a	Výtrhanie krajníkov alebo obrubníkov - nedávno realizovane	m	22. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	1877.751														
121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	240.956														
122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	19.992														
131201101	Hĺbenie jám a rýh nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	22. 08. 2022	26. 08. 2022	0.000	157.215														
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	106.647														
174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	70.560														
174101101	Zásyp štrkom el.šachty	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	0.392														
2	ZÁKLADY		22. 08. 2022	01. 09. 2022	0.000	0.000														
215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	3182.240														
215901101a	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	2162.400														
271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	20.225														
272322611	Šachty zo železobetónu odolného proti agresívnemu prostrediu C30/37 (zakl.doska, steny a strop)	m3	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	11.338														
273356021	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, zhotovenie	m2	22. 08. 2022	25. 08. 2022	0.000	79.860														
273356022	Debnenie základových dosiek a stien, ŽB, plochy rovinné, odstránenie	m2	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	79.860														
273357101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	8.400														
273357102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	8.400														
273357171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	7.120														
273357172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	7.120														

273361821	Výstuž šachiet BSt 500 (10505)	t	22. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	0.964															
274272201	Murivo základové z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	0.810															
274361821	Výstuž základových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	0.036															
275313611	Základové pátky a pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	22. 08. 2022	01. 09. 2022	0.000	37.237															
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		22. 08. 2022	28. 10. 2022	0.000	0.000															
430321414	Schodišťové konštrukcie a základy zo železobetónu tr. C25/30	m3	22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	27.213															
430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	22. 08. 2022	06. 09. 2022	0.000	2.177															
431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpurnou koňstr. do 4 m zhotovenie	m2	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	39.020															
431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpurnou koňstr. do 4 m odstránenie	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	39.020															
434121426	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	m	22. 08. 2022	28. 10. 2022	0.000	208.900															
434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C16/20	m	22. 08. 2022	26. 08. 2022	0.000	208.900															
434351141	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk zhotovenie	m2	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	41.780															
434351142	Debnenie stupňov priamočiarych a bokov dosiek schodísk odstránenie	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	41.780															
5	KOMUNIKÁCIE		22. 08. 2022	14. 02. 2023	0.000	0.000															
564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	2319.690															
564201111a	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	03. 09. 2022	0.000	2162.400															
564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	484.810															
564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 60 mm	m2	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	72.870															
564251111	Podklad pod rigol zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	22. 08. 2022	27. 08. 2022	0.000	369.538															
564361123	Podklad plôch z kameniva drveného 0-10 mm stabilizované hr. 50 mm	m2	22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	216.900															
564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-22 mm hr. 100 mm	m2	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	216.900															
564732111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 100 mm	m2	22. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	483.640															
564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 150 mm	m2	22. 08. 2022	06. 10. 2022	0.000	2363.490															
564751111a	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	29. 09. 2022	0.000	2162.400															
567116113	Podklad zo suchého prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	43.800															
567121125	Podklad pod rigol z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	22. 08. 2022	12. 09. 2022	0.000	369.538															
596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2	m2	22. 08. 2022	14. 02. 2023	0.000	2319.690															
596211131a	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100 m2 - nedávno realizovane	m2	22. 08. 2022	02. 02. 2023	0.000	2162.400															
596811231	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., vef. do 0,5 m2, pl. 50-100 m2	m2	22. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	72.870															
597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov 500/500/15 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	22. 08. 2022	27. 09. 2022	0.000	504.800															
597961113	Rigol dláždený z prefabrikátov atyp 350/625/120, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	19.610															
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	0.000															
631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm - podkladný betón	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	1.400															
631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	3.024															
631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	3.024															
631362162	Výstuž betónových mazanín do zvarovaných sietí Kari d drótu 6 mm, oko 15 cm	m2	22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	30.240															
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		22. 08. 2022	08. 10. 2022	0.000	0.000															
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22. 08. 2022	04. 10. 2022	0.000	1772.085															
916561111a	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - nedávno realizovane	m	22. 08. 2022	08. 10. 2022	0.000	1884.135															
917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	20.000															
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	1.200															
918101115	Duna zo suchej bet.zmesy z betónu tr. C 12/15 hr. 100 kompletne prevedenie s podsypom	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0.000	1.507															

919734106	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 5 do 6 cm	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	109.730													
919734211	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	109.730													
939922951	Osadenie betónových tvárnic elko 55-100 hrúbka 120 mm dĺžka páty 300 mm	kus	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	5.000													
939922952	Osadenie betónových tvárnic elko 55-50-50 hrúbka 120 mm dĺžka páty 500 mm	kus	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	2.000													
939951111	Lôžko pod tvárnice z betónu tr. C 12/15 so štrkovým podsypom	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	0.875													
953171011	Osadenie stupadiel	kus	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	8.000													
953171022	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových 50-100 kg	kus	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	2.000													
961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0,000	10.000													
976024500	Vybúranie hracích prvkov, smetných košov	kus	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	14.000													
976027600	Vybúranie lavíčiek a kvetníakov	kus	22. 08. 2022	25. 08. 2022	0,000	25.000													
976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	22. 08. 2022	25. 08. 2022	0,000	116.300													
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22. 08. 2022	10. 09. 2022	0,000	2679.665													
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	22. 08. 2022	13. 09. 2022	0,000	50913.635													
979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	22. 08. 2022	24. 09. 2022	0,000	1948.818													
979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.-z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	22. 08. 2022	02. 09. 2022	0,000	730.847													
979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	106.647													
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	22. 08. 2022	07. 09. 2022	0,000	4442.506													
D2	PRAČE A DODÁVKY PSV		01. 08. 2022	03. 03. 2023	0,000	0.000													
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		01. 08. 2022	03. 08. 2022	0,000	0.000													
711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	51.040													
711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	35.910													
711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom	m2	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	8.000													
711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom	m2	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	16.800													
711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	51.040													
711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	01. 08. 2022	03. 08. 2022	0,000	35.910													
998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	14.611													
713	Izolácie tepelné		01. 08. 2022	02. 08. 2022	0,000	0.000													
713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	01. 08. 2022	02. 08. 2022	0,000	35.910													
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	6.452													
722	Vnútrotný vodovod		01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	0.000													
722-1	Pitná fontánka vrátane prípojky (samostatný výkaz)	EU	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	1.000													
722-2	Interaktívna fontána vrátane prípojky a vsakovania (samostatný výkaz)	EU	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0,000	1.000													
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		01. 08. 2022	03. 03. 2023	0,000	0.000													
7672331101	Z1 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,13 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	08. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331102	Z2 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 8,45 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	08. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331103	Z3 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,98 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	11. 08. 2022	0,000	2.000													
7672331104	Z4 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,44 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	02. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331105	Z5 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	06. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331106	Z6 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 6,04 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	05. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331107	Z7 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 4,26 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	04. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331108	Z8 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 5,70 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	05. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331109	Z9 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,1 m dl. 5,82 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	05. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331110	Z10 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 2,14 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	02. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331111	Z11 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 1,80 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	02. 08. 2022	0,000	1.000													
7672331112	Z12 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 10,12 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	09. 08. 2022	0,000	1.000													

7672331113	Z13 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 12,40 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	13. 08. 2022	0.000	1.000															
7672331114	Z14 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 7,01 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	06. 08. 2022	0.000	1.000															
7672331115	Z15 Montáž a dodávka nerez. zábradlia v.1,0 m dl. 32,00 m vrátane kotvenia	kus	01. 08. 2022	03. 09. 2022	0.000	1.000															
767916100	Montáž a dodávka oplotenia z profilov 30x30 mm, plotových lamiel 116/1250/0,75 mm a stĺpkov 40x60 mm	m	01. 08. 2022	19. 08. 2022	0.000	17.030															
767916200	Montáž a dodávka polopodzemného kontajnera Molok na kounálny odpad	kus	01. 08. 2022	18. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911001	Montáž a dodávka Parková lavička Landscape compact LPC122t vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	18. 08. 2022	0.000	6.000															
7679911002	Montáž a dodávka Parková lavička Vera LV256 dl.1,8m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	17. 02. 2023	0.000	69.000															
7679911003	Montáž a dodávka Odpadkový kôš Diagonal DG315 45l vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	02. 12. 2022	0.000	43.000															
7679911004	Montáž a dodávka Infonosič IF120s 900x700 mm vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	19. 08. 2022	0.000	3.000															
7679911005	Montáž a dodávka Stojan na bicykle EDGE-TYRE STE210 vrátane spodnej	kus	01. 08. 2022	24. 08. 2022	0.000	24.000															
7679911007	Montáž a dodávka Lillie Base Modul Dolly SF v.1,4 m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	20. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911008	Montáž a dodávka Unimini Lago SF v.1,6m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	18. 10. 2022	0.000	1.000															
7679911009	Montáž a dodávka Ski Stepper Cast In Place v.1,47m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911010	Montáž a dodávka NRG Giants Causeway v.0,5m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	18. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911011	Montáž a dodávka Seesaw Baronessa SF v.0,8m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	22. 09. 2022	0.000	1.000															
7679911012	Montáž a dodávka All Terrain Vehicle v.0,7m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	12. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911013	Montáž a dodávka Anky Spring Toy v.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	06. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911014	Montáž a dodávka Kids Tramp d.0,98m s nosným rámom vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	03. 09. 2022	0.000	2.000															
7679911015	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 90 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	18. 10. 2022	0.000	9.000															
7679911016	Montáž a dodávka Sofiero Bench Curved 45 DN1400 mm vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	04. 10. 2022	0.000	16.000															
7679911017	Montáž a dodávka Sofiero kruhový stolík DN1100 mm vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	03. 11. 2022	0.000	15.000															
7679911018	Montáž a dodávka Sofiero otočné kresielko dl.0,6m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	18. 02. 2023	0.000	40.000															
7679911031	Montáž a dodávka Air Walker vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911032	Montáž a dodávka Wall - 3 pull-up bars - 2 benches + rope ringd vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	08. 09. 2022	0.000	1.000															
7679911033	Montáž a dodávka Carpet Beating Racket vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	14. 10. 2022	0.000	10.000															
7679911034	Montáž a dodávka Prístrešok Falcoloc 500 Cycle Store 4900x3980 4 pc vrátane spodnej stavby	kpl	01. 08. 2022	17. 02. 2023	0.000	1.000															
7679911035	Montáž a dodávka White Water.04 šmyklavka vo svahu vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	29. 09. 2022	0.000	1.000															
7679911036	Montáž a dodávka NGR Sierra Diablo v.1,75 m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911037	Montáž a dodávka Swing 2.50 v.1,5m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	18. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911038	Montáž a dodávka Lezecká stena do svahu dl.3,0m vrátane spodnej stavby	kus	01. 08. 2022	06. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911039	Montáž adodávka Tabule Sada kvetov 5 ks vrátane uchytenia	kpl	01. 08. 2022	01. 08. 2022	0.000	1.000															
7679911043	Montáž a dodávka detské ihrisko S05 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.40 mm (47,52 m2) a hr.50 mm (66,37 m2)	kpl	01. 08. 2022	05. 10. 2022	0.000	1.000															
7679911044	Montáž a dodávka detské ihrisko S07 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.70 mm (44,72+35,71+119,05+10,4 m2)	kpl	01. 08. 2022	03. 03. 2023	0.000	1.000															
7679911045	Montáž a dodávka detské ihrisko S08 PLAYTOP liaty gumený povrch hr.60 mm (35,84+112,84+2,64+6,27+3,77 m2)	kpl	01. 08. 2022	01. 12. 2022	0.000	1.000															
767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg - prašiaky, sušiaky prádla	kg	01. 08. 2022	02. 08. 2022	0.000	364.000															
D3	PRÁCE A DODÁVKY M		15. 08. 2022	15. 08. 2022	0.000	0.000															
M21	155 Elektromontáže		15. 08. 2022	15. 08. 2022	0.000	0.000															
210	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, zemné práce (samostatný výkaz)	EU	15. 08. 2022	15. 08. 2022	0.000	1.000															
2	pĺtna fontanka		22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	0.000															
HSV	Práce a dodávky HSV		22. 08. 2022	02. 09. 2022	0.000	0.000															
1	Zemné práce		22. 08. 2022	23. 08. 2022	0.000	0.000															

131201101.S	Výkop nezapažených jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	5.469
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.890
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	15.658
132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	5.158
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	6.830
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	18.275
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	6.830
171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	6.830
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	12.380
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	14.583
175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	3.320
4	Vodorovné konštrukcie		22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	0.000
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.764
8	Rúrové vedenie		22. 08. 2022	24. 08. 2022	0,000	0.000
871171001	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	7.000
871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	7.000
877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	2.000
877276041	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/40	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.000
891163	Montáž a dodávka vodomerovej zostavy	kpl	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	1.000
891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.000
891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.000
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	7.000
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	7.000
893810133	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0,000	1.000
895970003	Montáž vsakovacích blokov DRENKOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	22. 08. 2022	24. 08. 2022	0,000	1.296
894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.000
899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	1.000
899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	7.000
899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	7.000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		22. 08. 2022	02. 09. 2022	0,000	0.000
936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrútkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	22. 08. 2022	02. 09. 2022	0,000	1.000
99	Presun hmôt HSV		22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	0.000
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22. 08. 2022	23. 08. 2022	0,000	14.105
PSV	Práce a dodávky PSV		22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	0.000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	0.000
722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	2.000
998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22. 08. 2022	22. 08. 2022	0,000	0.119

[illegible]

4	sadové úpravy		10. 10. 2022	05. 11. 2022	0.000	0.000													
HSV	Práce a dodávky HSV		10. 10. 2022	05. 11. 2022	0.000	0.000													
1	Zemné práce		10. 10. 2022	05. 11. 2022	0.000	0.000													
180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	10. 10. 2022	12. 10. 2022	0.000	5270.000													
180402112	Založenie trávniku parkového výševom vo svahu nad 1:5 do 1:2	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	122.000													
0057211200	Tráva - trávové semeno parková zmes (40g/m2)	kg	10. 10. 2022	15. 10. 2022	0.000	210.800													
180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	91.000													
005720001401	Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylinný trávnik Agrostis. Vysev 15g/m2	kg	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	1.365													
182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	21. 10. 2022	0.000	5628.600													
182001122.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	190.800													
Pol1	Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	m3	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	46.000													
693410003,1	Zemina pre terrine modelácie vrátane dovozu	m3	10. 10. 2022	17. 10. 2022	0.000	46.000													
Pol2	Zasakovacia ryha štrkový vsak - Štrk frakcie 16 -32	m3	10. 10. 2022	14. 10. 2022	0.000	27.300													
Pol3	Geotextília	m2	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	180.000													
693410004	Dodávka Piesok 0 -1, vrátane dovozu	m3	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	9.100													
693410005	Dodávka zeminy : zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	M3	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0.000	30.400													
183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem do 0,01 m3	ks	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	1988.000													
183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	10. 10. 2022	17. 10. 2022	0.000	1431.000													
183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	10. 10. 2022	18. 10. 2022	0.000	43.000													
5812162000r1	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	m3	10. 10. 2022	26. 10. 2022	0.000	419.100													
183205112	Založenie záhonu a kríkov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vrátane vyhlbenia jamiek	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	336.400													
183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	336.400													
183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	5697.400													
183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0.000	5697.400													
183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	5361.000													
183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	426.000													
183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	1562.000													
02662010300	Allium afatanense 'Purple Sensation'	ks	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0.000	142.000													
02662010301	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	15.000													
02662010302	Artemisia schmidtiana 'Nana'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	45.000													
02662010303	Calamagrostis brachytricha	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	17.000													
02662010304	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	ks	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0.000	355.000													
02662010305	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	18.000													
02662010306	Filipendula vulgaris 'Plena'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	24.000													
02662010307	Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	58.000													
02662010308	Gaura lindheimeri	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	15.000													
02662010309	Gypsophyla repens 'Rosea'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	21.000													
02662010310	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	17.000													
02662010311	Iris x barbata 'Nana'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	21.000													
02662010312	Knautia macedonica 'Mars Midget'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	17.000													
02662010313	Linum perenne	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0.000	19.000													

02662010314	Narcissus jonquilla 'Baby Moon'	ks	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0,000	355,000													
02662010315	Narcissus poeticus var. recurvus	ks	10. 10. 2022	14. 10. 2022	0,000	355,000													
02662010316	Potentilla neumanniana	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	26,000													
02662010317	Phlomis russeliana	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	21,000													
02662010318	Paeonia tenuifolia 'Plena'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	11,000													
02662010319	Rudbeckia fulgida sulivantii 'Goldsturm'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	21,000													
02662010320	Sedum telephium 'Herbstfreunde'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	26,000													
02662010321	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0,000	355,000													
02662010322	Veronica teucricum 'Konigsblau'	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	34,000													
184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujucej zeminy z	ks	10. 10. 2022	12. 10. 2022	0,000	43,000													
02662011001	Amelanchier arborea 'Robin Hill' 16 - 18	ks	10. 10. 2022	05. 11. 2022	0,000	12,000													
02662011002	Acer campestre 'Elsrijk' 17 - 20	ks	10. 10. 2022	27. 10. 2022	0,000	11,000													
02662011013	Acer platanoides 'Cleveland' 17 - 20	ks	10. 10. 2022	12. 10. 2022	0,000	2,000													
02662011004	Fraxinus angustifolia 'Raywood' 18 - 20	ks	10. 10. 2022	26. 10. 2022	0,000	11,000													
02662011005	Fagus sylvatica 20 - 25	ks	10. 10. 2022	15. 10. 2022	0,000	3,000													
02662011006	Prunus x yedoensis 17 - 20	ks	10. 10. 2022	15. 10. 2022	0,000	4,000													
184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	10. 10. 2022	12. 10. 2022	0,000	672,000													
184701111.S	Výsadba živého plotu do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	ks	10. 10. 2022	12. 10. 2022	0,000	759,000													
026550000101	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 30 -40	ks	10. 10. 2022	18. 10. 2022	0,000	566,000													
026550000102	Parthenocissus tricuspidata, 30 - 60	ks	10. 10. 2022	12. 10. 2022	0,000	106,000													
026550000103	Spiraea betulifolia 40 - 60	ks	10. 10. 2022	21. 10. 2022	0,000	759,000													
184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od2 m do 3 m	ks	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	43,000													
05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0,000	129,000													
05212050002	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	193,500													
184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	43,000													
184501111	Aplikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	21,500													
67352211000	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou tplotou, alebo mrazom	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	21,500													
184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	2457,000													
25111112000	Tabletové zásobné hnojivo 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	4617,000													
184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	336,400													
59386000020d	Drvené kamenivo, Melafyr,vrstva hrúbky 7 cm, fr. 8/16mm,vrátane nákupu a dovozu	m3	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	4,970													
0554151000	mulčovací materiál - borovicová kôra fr. 0,5-3cm	m3	10. 10. 2022	14. 10. 2022	0,000	18,578													
6936651300r	Mulčovacia ekotextília netkaná 50g/m2	m2	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	265,400													
185803111,1	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	m2	10. 10. 2022	13. 10. 2022	0,000	5361,000													
185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	5361,000													
185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2: stromy 50l , 5x	m3	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	10,750													
185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kríky)	m3	10. 10. 2022	10. 10. 2022	0,000	13,456													
185804312r	Zaliatie trávniku (2x 20L/m2)	m3	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	107,220													
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	10. 10. 2022	11. 10. 2022	0,000	131,426													

[illegible]


220185001	Zafúkanie 1x optického kábla, vonk. sieť	m	14. 11. 2022	01. 12. 2022	0.000	32.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----------	--	---	--------------	--------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


212752124	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	70.000															
215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	520.000															
274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	0.144															
4	Vodorovné konštrukcie		29. 08. 2022	05. 09. 2022	0.000	0.000															
434121416.1	Osadzovanie schodiskových stupňov do maltového ložka hr. 100 mm	m	29. 08. 2022	05. 09. 2022	0.000	20.000															
5	Komunikácie		29. 08. 2022	26. 09. 2022	0.000	0.000															
564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	7.600															
564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	7.000															
564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	29. 08. 2022	15. 09. 2022	0.000	520.000															
596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	7.600															
596911212	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	29. 08. 2022	26. 09. 2022	0.000	436.000															
8	Rúrové vedenie		29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	0.000															
899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	2.000															
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		29. 08. 2022	20. 09. 2022	0.000	0.000															
916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	8.400															
917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29. 08. 2022	20. 09. 2022	0.000	363.000															
918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	29. 08. 2022	01. 09. 2022	0.000	11.079															
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	18.000															
935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálného MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	29. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	6.000															
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	125.232															
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	4383.120															
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	125.232															
99	Presun hmôt HSV		29. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	0.000															
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s kytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29. 08. 2022	31. 08. 2022	0.000	727.239															
2	sadové upravy		29. 08. 2022	09. 09. 2022	0.000	0.000															
HSV	Práce a dodávky HSV		29. 08. 2022	09. 09. 2022	0.000	0.000															
1	Zemné práce		29. 08. 2022	09. 09. 2022	0.000	0.000															
18040.001	Založenie trávniku výsevom	m2	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	264.200															
18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Líp -12 ks	ks	29. 08. 2022	09. 09. 2022	0.000	12.000															
99	Presun hmôt HSV		29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	0.000															
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	t	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	1.808															
3	Dažďové záhrady		29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	0.000															
HSV	HSV		29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	0.000															
1	Zemné práce		29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	0.000															
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	11.760															
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	11.760															


162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	11.760													
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	388.080													
167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	11.760													
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	11.760													
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	21.756													
174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m3	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	6.860													
174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m3	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	8.820													
181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacími substrátom hr.50-100 mm	m2	29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	19.600													
183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	116.000													
185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	29. 08. 2022	29. 08. 2022	0.000	0.196													
99	Presun hmôt HSV		29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	0.000													
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	29. 08. 2022	30. 08. 2022	0.000	16.375													
3	Parkovisko z ul. obrancov mieru		21. 11. 2022	12. 12. 2022	0.000	0.000													
1	Stavebná úprava		21. 11. 2022	12. 12. 2022	0.000	0.000													
HSV	HSV		21. 11. 2022	12. 12. 2022	0.000	0.000													
1	Zemné práce		21. 11. 2022	09. 12. 2022	0.000	0.000													
113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	21. 11. 2022	23. 11. 2022	0.000	477.600													
113206111	Vyrthanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	21. 11. 2022	21. 11. 2022	0.000	94.700													
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	21. 11. 2022	22. 11. 2022	0.000	144.000													
122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	21. 11. 2022	21. 11. 2022	0.000	144.000													
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21. 11. 2022	22. 11. 2022	0.000	144.000													
162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21. 11. 2022	25. 11. 2022	0.000	4752.000													
167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	21. 11. 2022	21. 11. 2022	0.000	144.000													
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21. 11. 2022	09. 12. 2022	0.000	266.400													
181301106	Rozprestretie humóznej vrstvy, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	21. 11. 2022	28. 11. 2022	0.000	154.000													
2	Zakladanie		21. 11. 2022	22. 11. 2022	0.000	0.000													
212752124	Tratívody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	21. 11. 2022	22. 11. 2022	0.000	40.000													
215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	21. 11. 2022	21. 11. 2022	0.000	520.000													
5	Komunikácie		21. 11. 2022	12. 12. 2022	0.000	0.000													
564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21. 11. 2022	22. 11. 2022	0.000	64.200													
564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	21. 11. 2022	10. 12. 2022	0.000	520.000													
596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	21. 11. 2022	25. 11. 2022	0.000	64.200													
596911212	Kladenie vegetačnej tvarnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zásypom	m2	21. 11. 2022	12. 12. 2022	0.000	341.200													
8	Rúrové vedenie		21. 11. 2022	21. 11. 2022	0.000	0.000													
899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	21. 11. 2022	21. 11. 2022	0.000	2.000													
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		21. 11. 2022	09. 12. 2022	0.000	0.000													


[illegible]

[illegible]

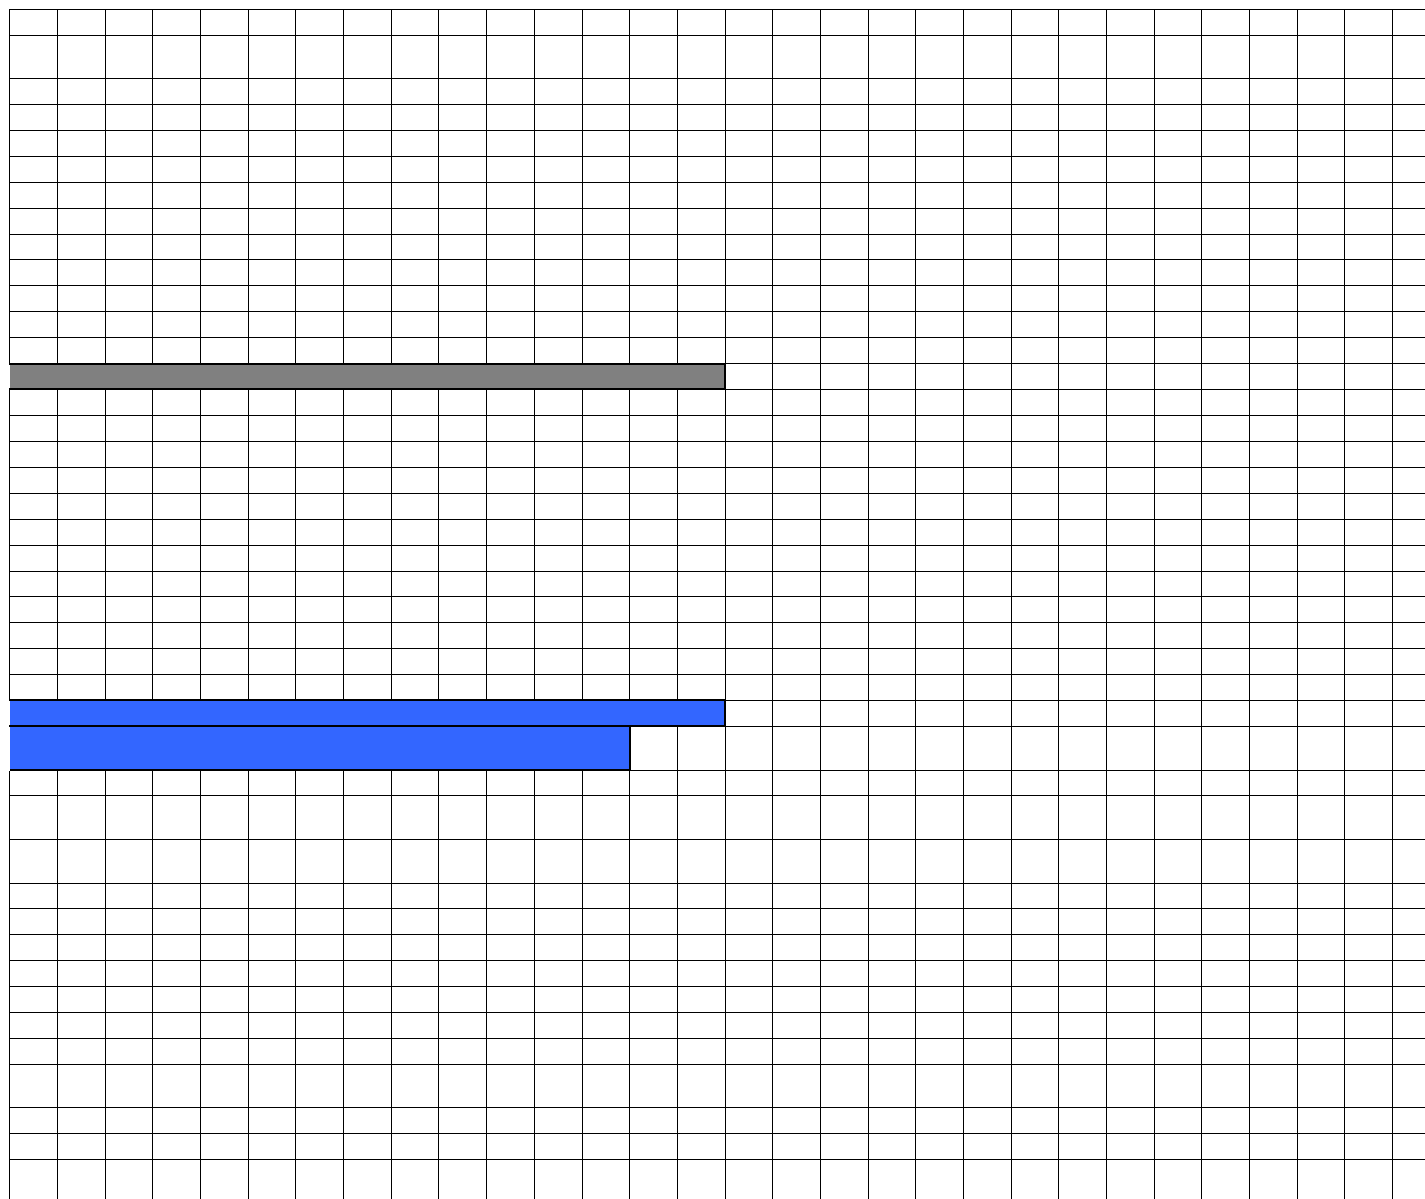

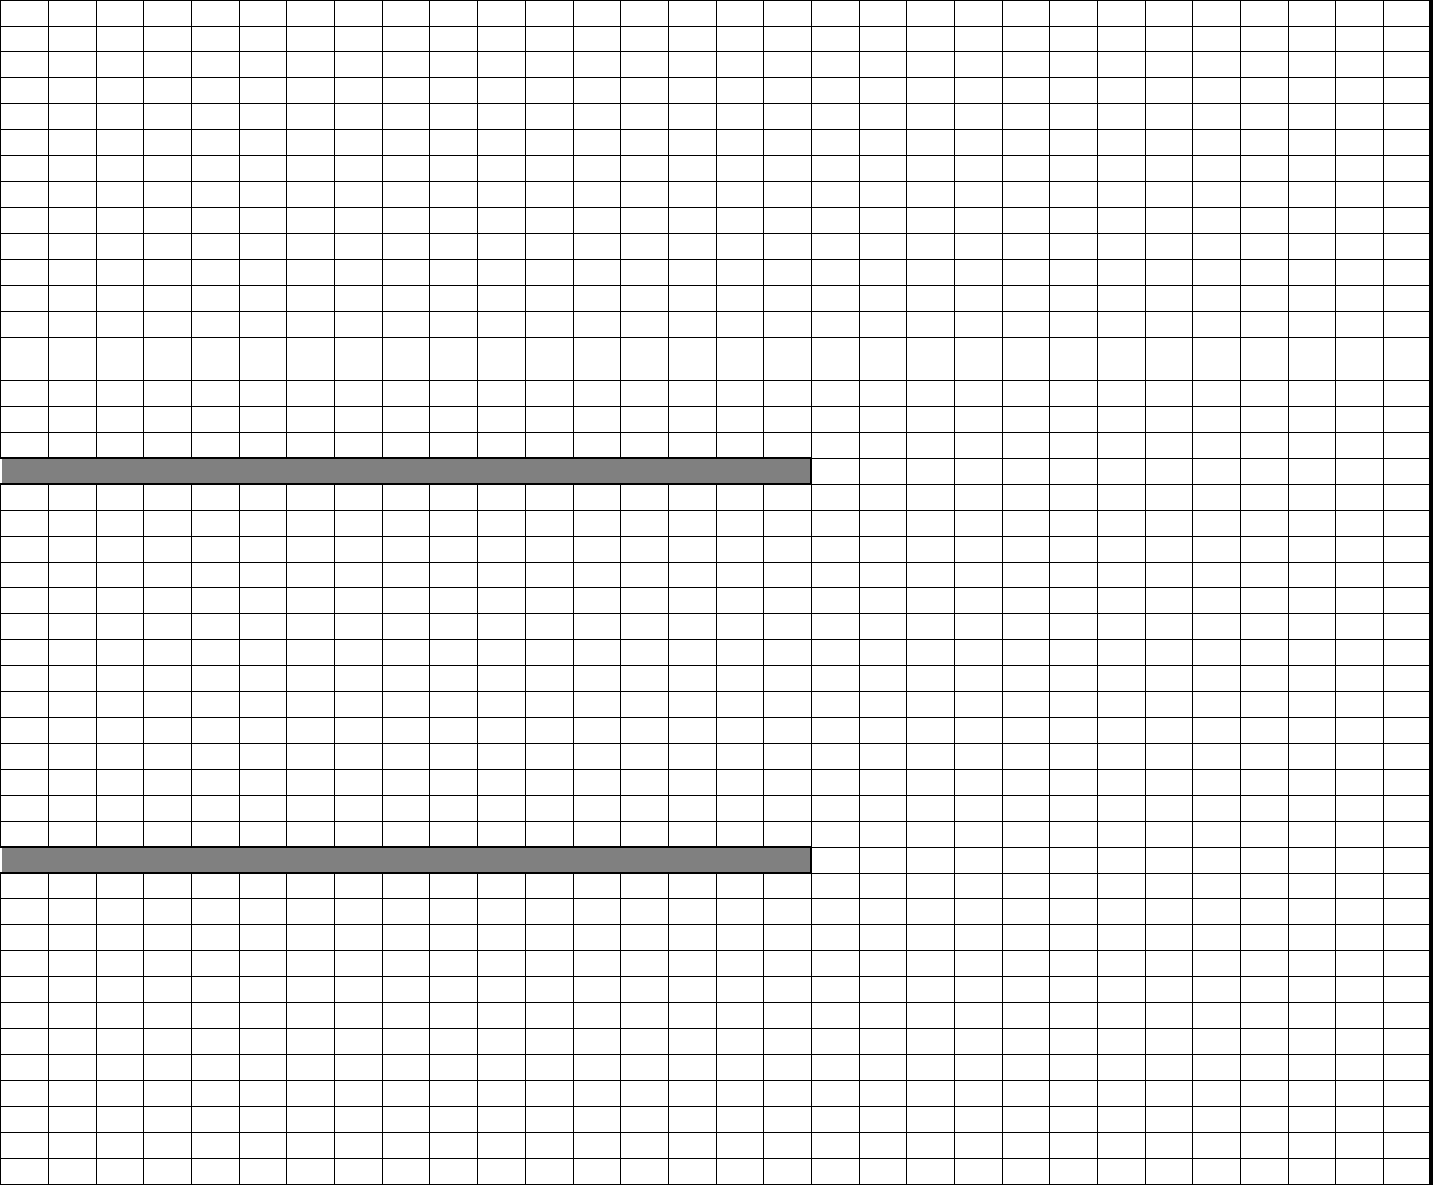

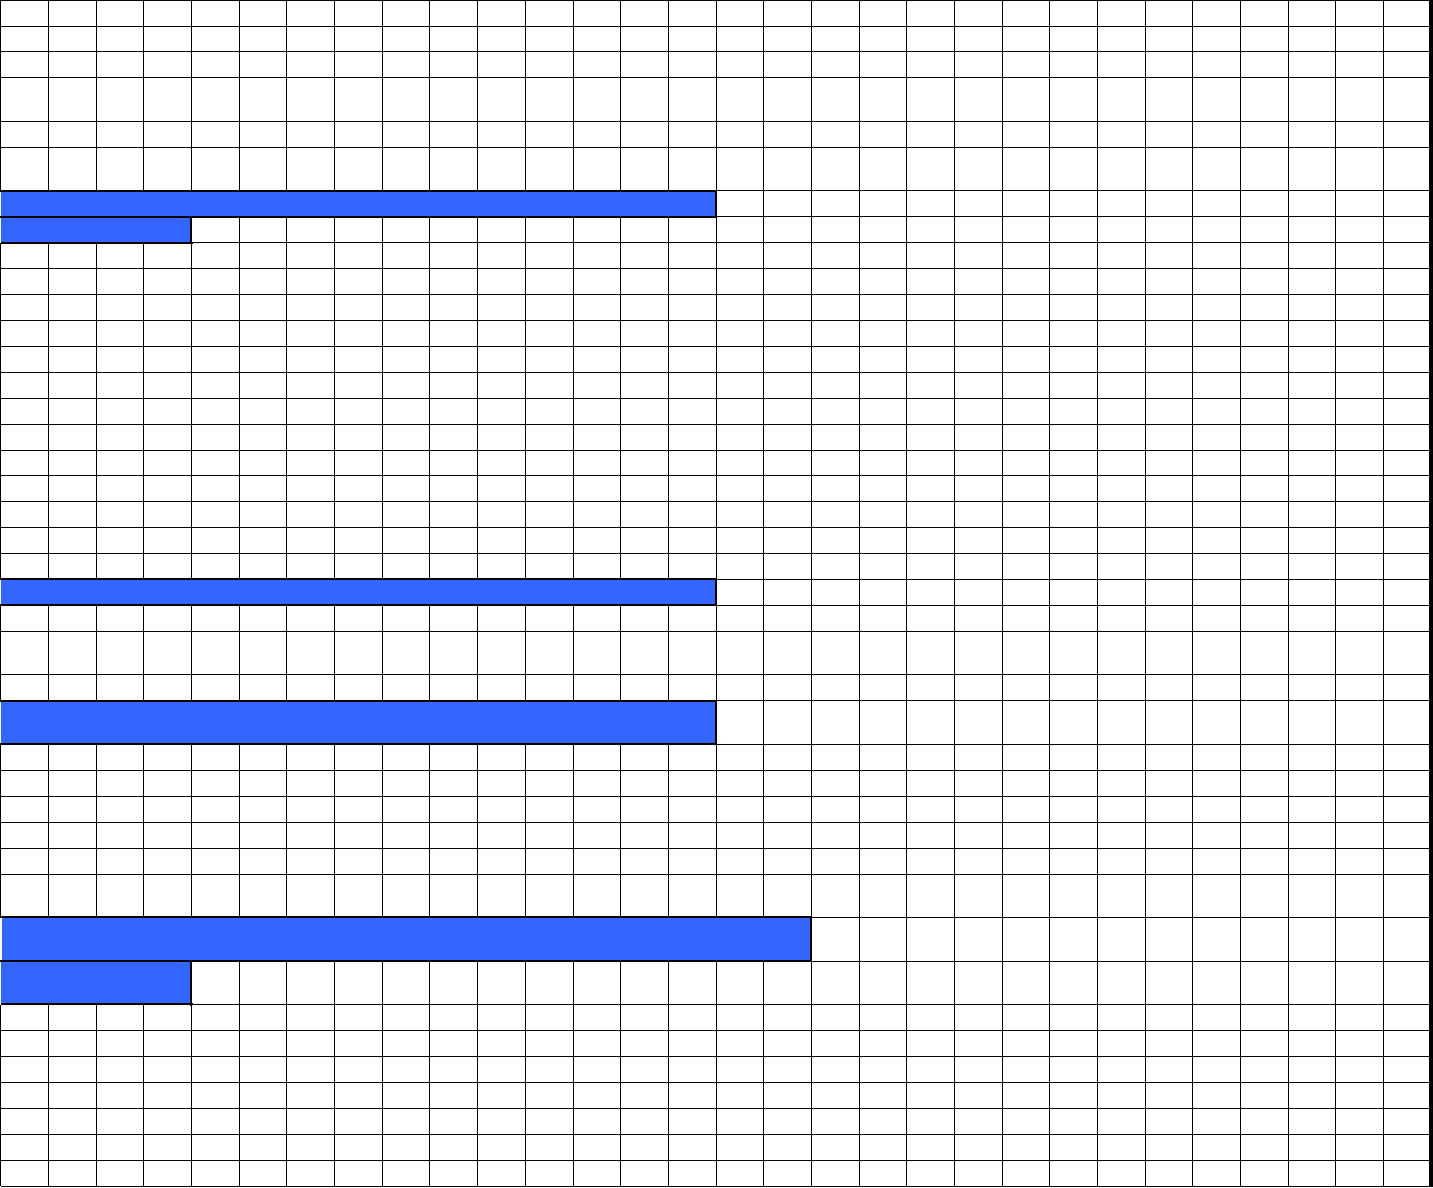

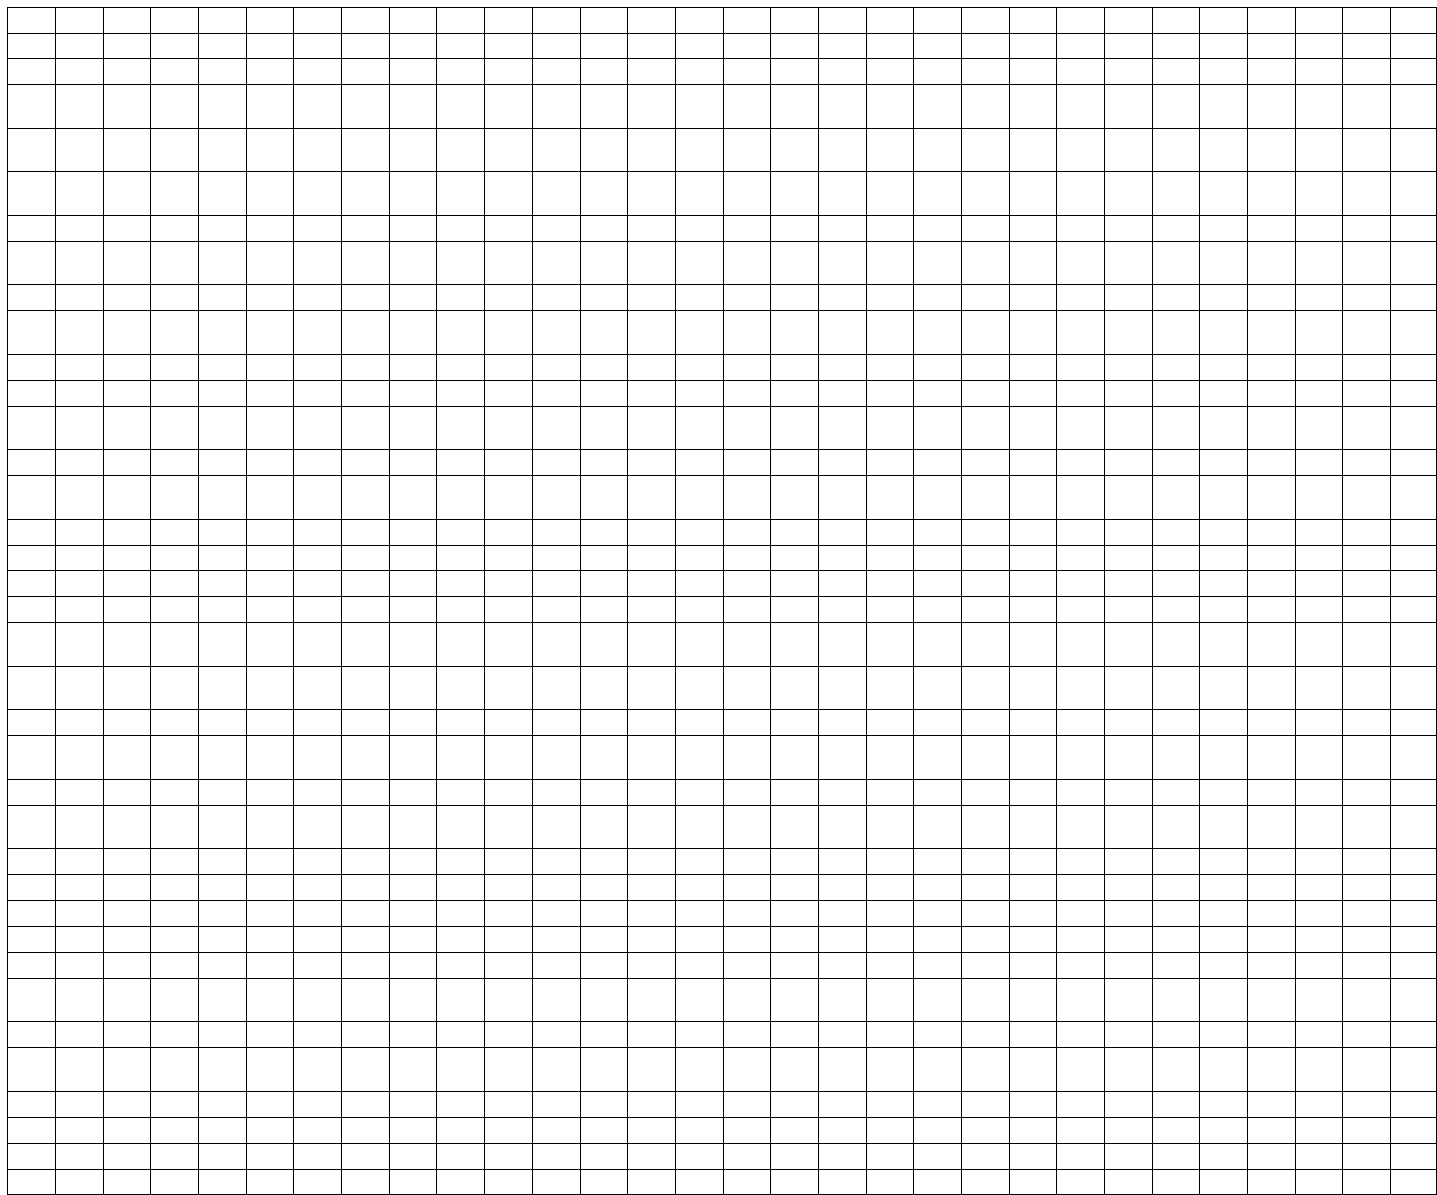

[illegible]

