


## Harmonogram stavby "Rekonštrukcia ZŠ Majerníkova 60, Bratislava"


Kód položky	Mesiac							
	Týždeň							
	Deň							
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh	Množstvo
<b>06</b>	<b>Rekonštrukcia ZŠ Majerníkova 60, Bratislava</b>				<b>74,01</b>	<b>169 250,14</b>	<b>603,992</b>	<b>0,000</b>
<b>0634</b>	<b>Havarijný stav ležaté rozvody</b>				<b>61,95</b>	<b>62 474,60</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>006-03</b>	<b>Ležaté rozvody - ZTI</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 25. 2020</b>	<b>51,16</b>	<b>24 770,71</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 25. 2020</b>	<b>51,16</b>	<b>24 770,71</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné		06. 15. 2020	06. 23. 2020	6,95	2 307,01	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		06. 15. 2020	08. 25. 2020	51,16	16 982,60	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety		06. 15. 2020	07. 07. 2020	16,51	5 481,09	0,000	0,000
<b>006-04</b>	<b>Ležaté rozvody - celkový výmer+ stavebná časť</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>09. 08. 2020</b>	<b>61,95</b>	<b>37 703,89</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>07. 17. 2020</b>	<b>24,95</b>	<b>11 681,63</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce		06. 15. 2020	06. 17. 2020	0,19	62,04	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie		06. 15. 2020	06. 28. 2020	1,21	402,64	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		06. 15. 2020	07. 17. 2020	24,95	8 280,74	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		06. 15. 2020	06. 25. 2020	8,47	2 812,35	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV		06. 15. 2020	08. 30. 2020	0,37	123,87	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>09. 08. 2020</b>	<b>61,95</b>	<b>26 022,26</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		06. 15. 2020	07.01.20	0,00	0,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety		06. 15. 2020	06. 15. 2020	0,54	180,12	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby		06. 15. 2020	06. 29. 2020	10,55	3 503,55	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové		06. 15. 2020	09. 08. 2020	61,95	20 565,24	0,000	0,000
781	Obklady		07.06.20	07. 19. 2020	4,40	1 460,58	0,000	0,000
784	Maľby		07.03.20	07.09.20	0,94	312,77	0,000	0,000
<b>0612</b>	<b>Komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení - 4. podlažia</b>				<b>74,01</b>	<b>106 775,54</b>	<b>603,992</b>	<b>0,000</b>
<b>006-01</b>	<b>Všetky poschodia - zdravotníka</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 31. 2020</b>	<b>55,87</b>	<b>28 583,82</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>06. 16. 2020</b>	<b>1,47</b>	<b>1 177,49</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		06. 15. 2020	06. 28. 2020	1,39	460,54	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		07.01.20	07.09.20	0,69	230,16	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		06. 15. 2020	06. 28. 2020	1,47	486,79	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 31. 2020</b>	<b>55,87</b>	<b>27 406,33</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné		07.06.20	07. 19. 2020	2,52	835,47	0,000	0,000

721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	06. 15. 2020	06. 24. 2020	7,54	2 501,41	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	06. 15. 2020	07. 06. 2020	15,47	5 134,80	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	06. 15. 2020	08. 31. 2020	55,87	18 545,20	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	06. 15. 2020	07. 19. 2020	1,07	356,25	0,000	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	06. 15. 2020	07.09.20	0,10	33,20	0,000	0,000
<b>006-02</b>	<b>Všetky poschodia - architektúra rekonštrukcia hygienických zariadení</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 31. 2020</b>	<b>74,01</b>	<b>67 303,36</b>	<b>45,112</b>	<b>0,000</b>
<b>D1</b>	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 05. 2020</b>	<b>37,17</b>	<b>21 620,17</b>	<b>45,112</b>	<b>0,000</b>
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	06. 15. 2020	08. 31. 2020	37,17	12 339,86	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	06. 15. 2020	08. 31. 2020	0,58	9 280,32	45,112	0,000
<b>D2</b>	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08. 31. 2020</b>	<b>74,01</b>	<b>45 462,23</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	06. 15. 2020	07. 20. 2020	3,61	1 198,33	0,000	0,000
72	ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	06. 15. 2020	06. 15. 2020	0,00	0,00	0,000	0,000
735	Vykurovacie telesá	06. 15. 2020	08. 23. 2020	2,63	872,32	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	06. 15. 2020	08. 31. 2020	28,99	9 624,38	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	06. 15. 2020	06. 16. 2020	1,54	509,54	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc keramických	06. 15. 2020	07. 31. 2020	16,71	5 547,87	0,000	0,000
781	Obklady z obkladačiek a dosiek	06. 15. 2020	09. 25. 2020	74,01	24 565,29	0,000	0,000
783	Nátery	06. 15. 2020	08. 16. 2020	3,45	1 143,82	0,000	0,000
784	Maľby	06. 15. 2020	08. 23. 2020	6,03	2 000,67	0,000	0,000
<b>D3</b>	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>0,67</b>	<b>220,96</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
M21	155 Elektromontáže	06. 15. 2020	07. 31. 2020	0,00	0,00	0,000	0,000
M24	158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	06. 15. 2020	07. 31. 2020	0,67	220,96	0,000	0,000
<b>006-03</b>	<b>Rekonštrukcia hygienických zariadení elektroinštalácia</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>06. 29. 2020</b>	<b>10,57</b>	<b>10 888,36</b>	<b>558,880</b>	<b>0,000</b>
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>10 888,36</b>	<b>558,880</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M</b>	<b>Elektroinštalácia - MONTÁŽ</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>10 888,36</b>	<b>558,880</b>	<b>0,000</b>
D-VP	Nezaradené položky dielu /21-M - Elektroinštalácia - MONTÁŽ/	06. 15. 2020	08.11.20	6,27	1 480,80	491,040	0,000
<b>92</b>	<b>Elektroinštalácia - MATERIÁL</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>9 407,56</b>	<b>67,840</b>	<b>0,000</b>
D-VP	Nezaradené položky dielu /92 - Elektroinštalácia - MATERIÁL/	06. 15. 2020	08.11.20	0,00	1 963,52	0,000	0,000
<b>36-M</b>	<b>Rozvádzače MONTÁŽ - Dozbrojenie R</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>7 444,04</b>	<b>67,840</b>	<b>0,000</b>
D-VP	Nezaradené položky dielu /36-M - Rozvádzače MONTÁŽ - Dozbrojenie R/	06. 15. 2020	08.11.20	0,87	460,00	67,840	0,000
<b>25-M</b>	<b>Rozvádzače MATERIÁL - Dozbrojenie R</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>6 984,04</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
D-VP	Nezaradené položky dielu /25-M - Rozvádzače MATERIÁL - Dozbrojenie R/	06. 15. 2020	08.11.20	3,74	1 240,04	0,000	0,000
<b>M</b>	<b>Svietidlá MONTÁŽ</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>5 744,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
D-VP	Nezaradené položky dielu / M - Svetidlá MONTÁŽ/	06. 15. 2020	08.11.20	2,60	864,00	0,000	0,000
<b>D</b>	<b>Svietidlá DODÁVKA</b>	<b>06. 15. 2020</b>	<b>08.11.20</b>	<b>10,57</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
D-VP	Nezaradené položky dielu /D - Svetidlá DODÁVKA/	06. 15. 2020	08.11.20	10,57	3 510,00	0,000	0,000
HZS, Ostatné	HZS, Ostatné - Demontážne práce	06. 15. 2020	06. 19. 2020	4,13	1 370,00	0,000	0,000

	Jún 2020																											
	25. T							26. T							27. T							28. T						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Časová náročnosť																												
579,71																												
485,31																												
400,77																												
400,77																												
54,44																												
400,77																												
129,35																												
485,31																												
195,41																												
1,46																												
9,50																												
195,41																												
66,37																												
2,92																												
485,31																												
0,00																												
4,25																												
82,68																												
485,31																												
34,47																												
7,38																												
579,71																												
437,64																												
11,49																												
10,87																												
5,43																												
11,49																												
437,64																												
19,72																												

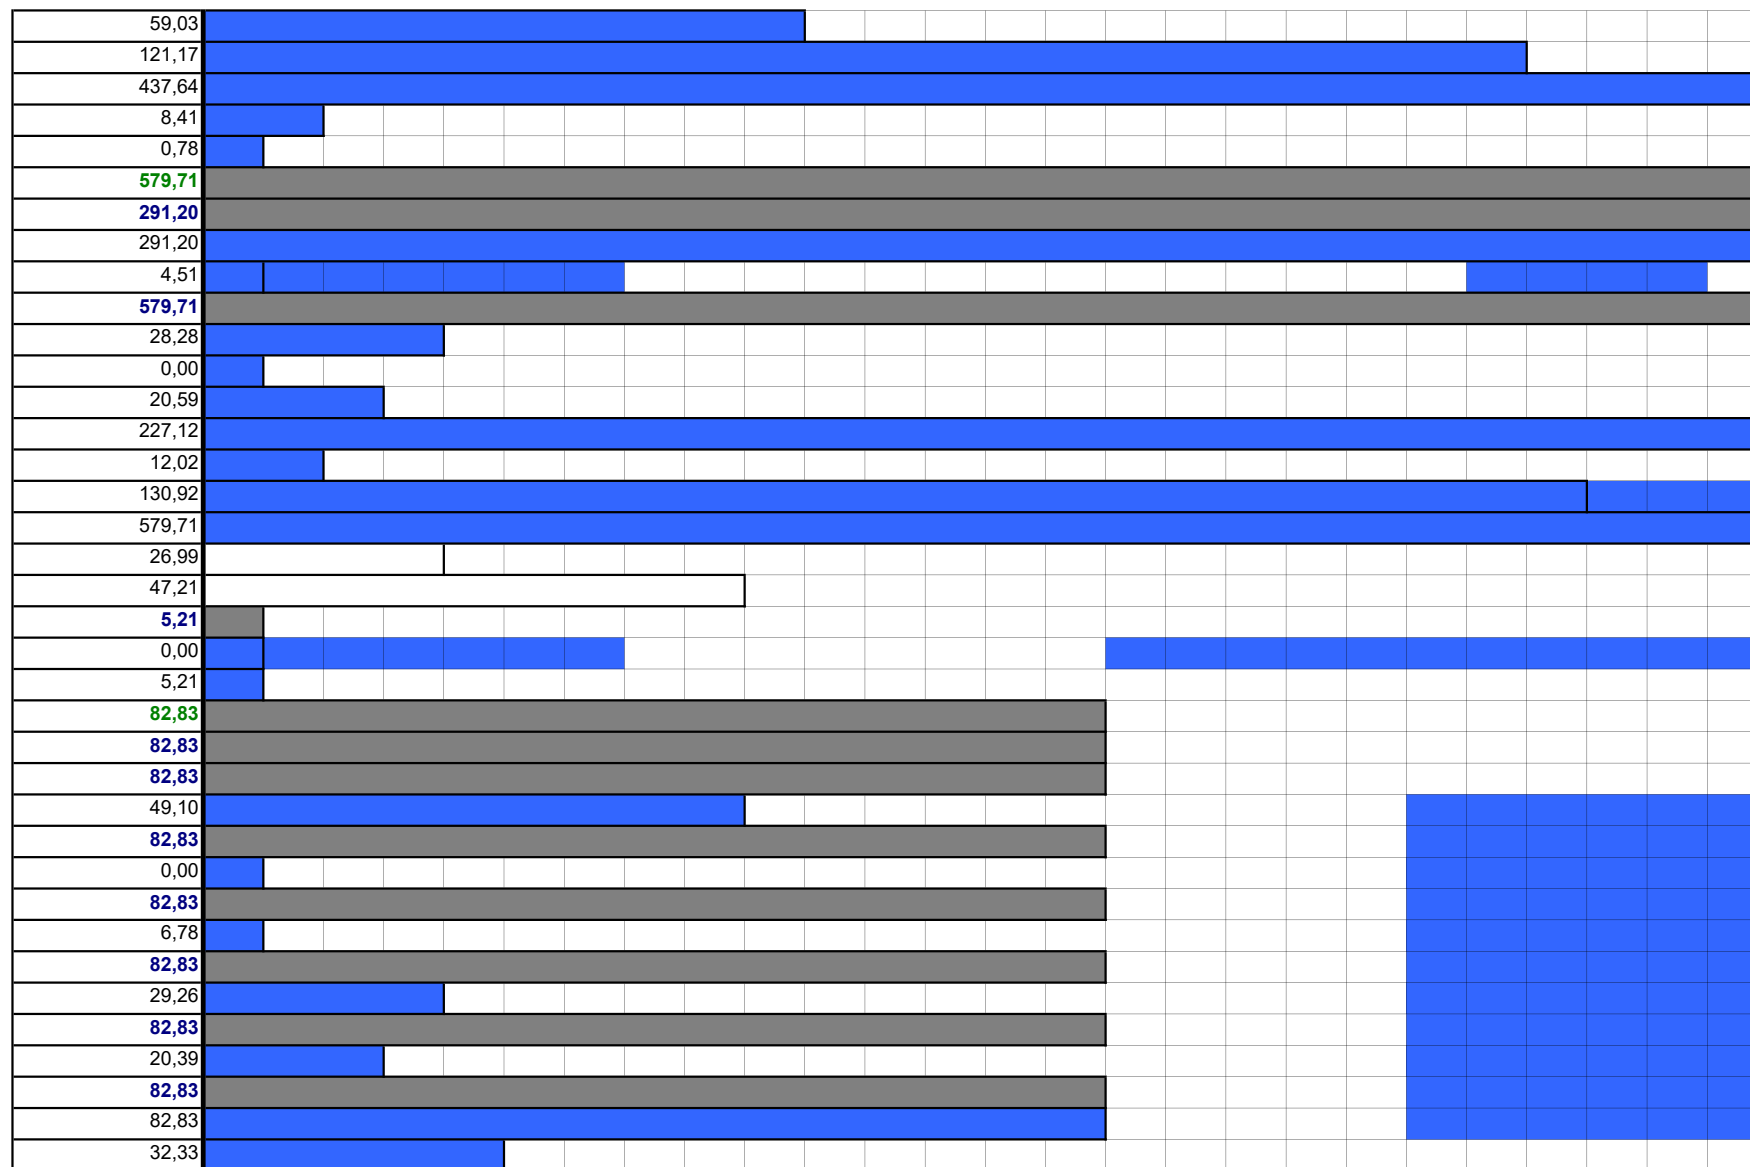

Júl 2020																													
		29. T							30. T							31. T							32. T						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	

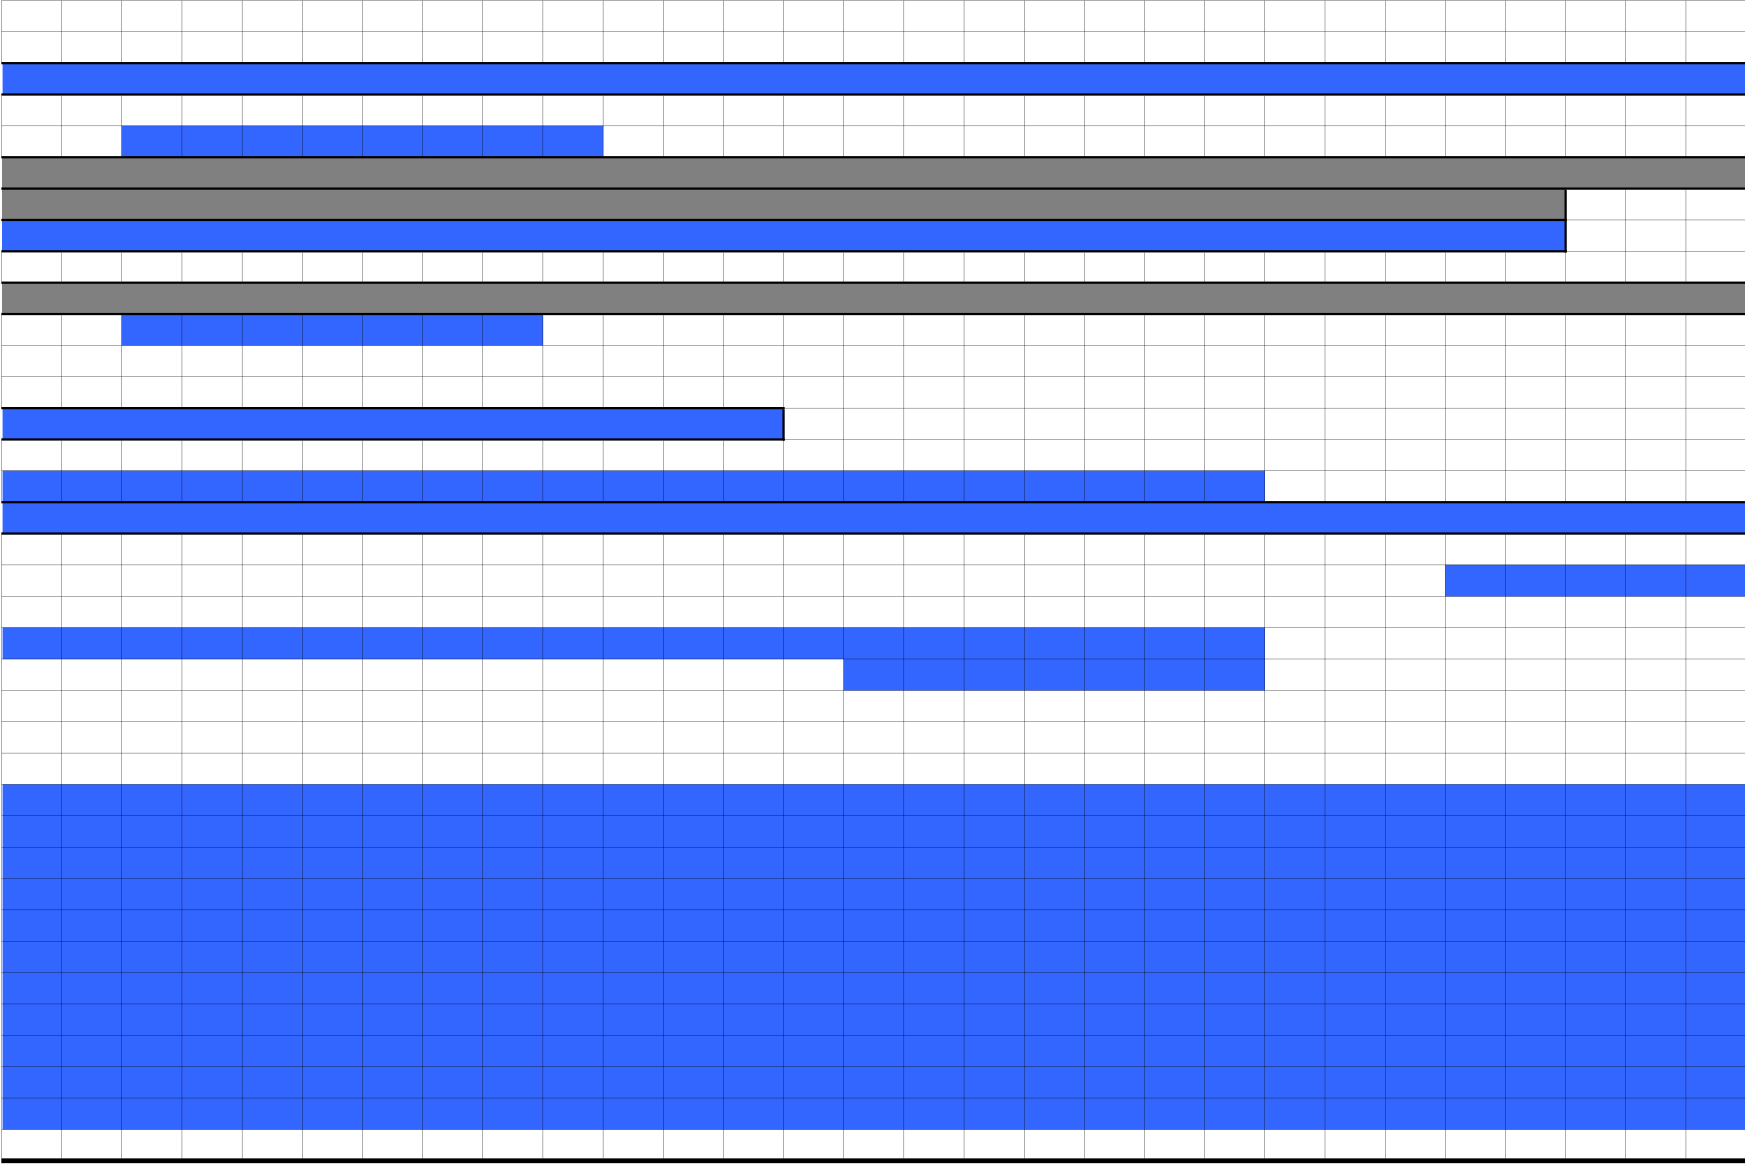

[illegible]







